



CONTRATACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Adjudicaciones y Liquidaciones de obras 1996-2007

Volumen de obra adjudicado en 2007	246.475.575 euros (41.010 millones de pesetas)
Volumen de obra liquidada en 2007	145.969.506 euros (24.287 millones de pesetas)
Desviación-incremento medio en las obras liquidadas en 2007	+ 5,98%
Nº de contratos con desviación-incremento en liquidación superior al 10 % en 2007	2
Nº de contratos con desviación-incremento en liquidación inferior al 10% en 2007	68
Volumen de obra adjudicado en el periodo 1996-2007 (12 años) (incluyendo Autovía Pamplona-Logroño)	1.389.668.684 euros (231.221 millones de pesetas)
Volumen de obra liquidada en el periodo 1997-2007 (11 años)	909.428.492 euros (151.316 millones de pesetas)
Desviación-incremento medio en las liquidaciones de obra en el periodo 1997-2007 (11 años)	+7,80%

Los objetivos marcados por el Gobierno de Navarra de conseguir una disminución sustancial de los costes finales de las obras, en relación con sus precios de adjudicación y dar la máxima transparencia a las adjudicaciones de obras, dieron lugar a la elaboración del Informe Anual cuya primera edición se llevó a cabo en el año 1997 (datos del ejercicio 1996), como un instrumento más del control de la gestión llevada a cabo por el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones.



De este Informe Anual se extraen los siguientes resultados y cifras más relevantes.

NÚMERO DE CONTRATOS ADJUDICADOS Y LIQUIDADOS

El número total de Contratos (Obras y Asistencias Técnicas) Adjudicados y Liquidados a lo largo del año 2007 refleja la actividad desarrollada por el Departamento.

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Contratos Adjudicados	160	226	200	229	195	219	181	74(*)	59	94	72	91
Contratos Liquidados	92	137	192	258	211	222	176	100(*)	113	116	90	103


(*) Desde 2003 no se incluyen los contratos del Servicio de Telecomunicaciones, cuya actividad se incorporó al Departamento de Economía y Hacienda.

EVOLUCIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS


Año	Importe (pesetas)	Importe (euros)
1992	4.075.801.116	24.496.058
1993	8.606.006.431	51.723.140
1994	10.650.654.915	64.011.725
1995	5.422.279.678	32.588.557
1996	8.558.226.587	51.435.978
1997	18.167.527.494	109.189.039
1998	15.749.442.619	94.656.057
1999	14.048.297.890	84.431.971
2000	11.233.793.214	67.516.457
2001	12.594.133.725	75.692.268
2002 Con Autovía Pamplona-Logroño	68.987.442.156	414.622.878
2002 Sin Autovía Pamplona-Logroño	15.037.613.942	90.377.880
2003	19.515.761.021	117.393.411
2004	3.996.707.691	24.020.697
2005	8.802.623.710	52.904.834
2006	7.582.963.249	45.574.527
2007	41.010.085.021	246.475.575



Importe de obra adjudicada en miles de euros
Sin incluir la Autovía Pamplona-Logroño = 330 M. euros (2002)

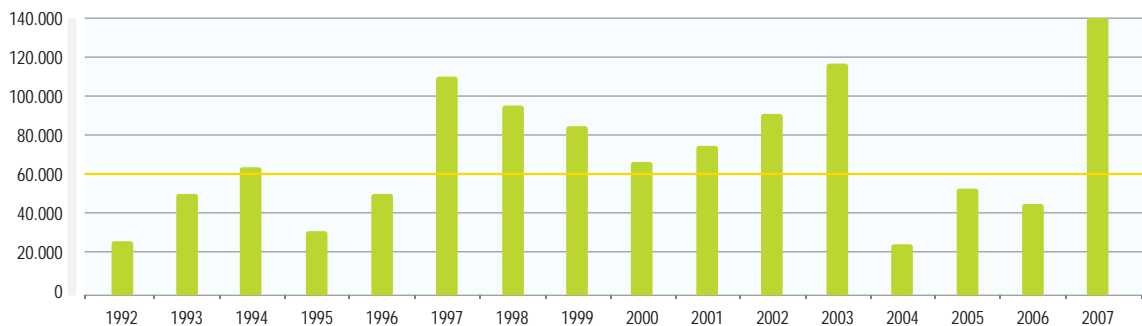

Importe de obra adjudicada en miles de euros
Incluyendo la Autovía Pamplona-Logroño = 330 M. euros (2002)

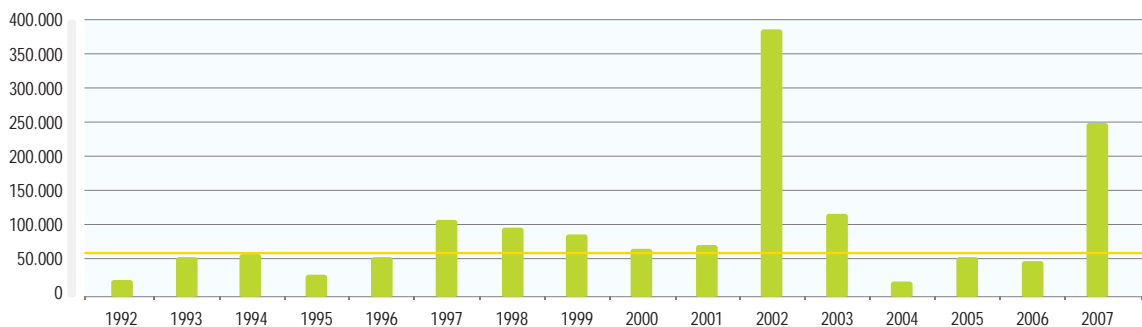

VOLUMEN ADJUDICADO EN EL PERIODO 1996 - 2007

En conjunto, incluyendo la Autovía Pamplona - Logroño, el volumen de contratación de obras por el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones en los últimos doce años (1996-2007) ha ascendido a 1.389.668.684 euros (231.221 millones de pesetas).

De dicho importe, 198.311.481 euros corresponden al "Plan de Aceleración de los Ejes Estratégicos de Comunicaciones de Navarra y de otras actuaciones en Carreteras de Interés Territorial".




BAJA MEDIA ANUAL DE ADJUDICACIONES DE OBRAS

El porcentaje de Baja Media Anual en las Adjudicaciones de obra también es un dato representativo de la gestión de contratación y se obtiene comparando el total de Presupuesto Adjudicado con los Presupuestos de Proyecto (Obra licitada) por el Departamento.

Los datos referentes a esta Baja Media Anual son los siguientes:

Año	Baja media anual de Adjudicación de obras
1995	-30,5%
1996	-24,6%
1997	-25,6%
1998	-11,1%
1999	-8,5%
2000	-11,8%
2001	- 8,7%
2002	- 4,7%
2003	- 9,2%
2004	-9,2%
2005	-9,8%
2006	-5,1%
2007	-10,6%

Dirección General de Obras Públicas
Baja media de adjudicaciones de obra

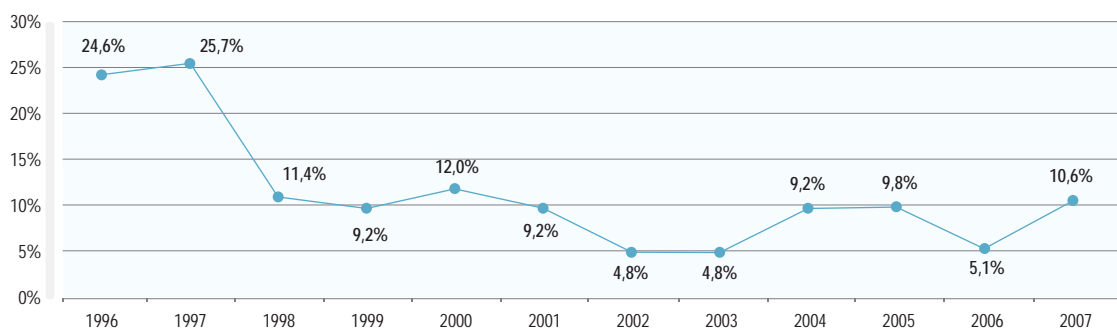

DESVIACIÓN MEDIA ANUAL DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS


Otro dato que, sin duda, es uno de los de mayor relevancia desde el punto de vista de la gestión de la Administración en relación con la contratación de obra es la desviación media anual.

El Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, se marcó como objetivo a partir de 1996 el rebajar las desviaciones finales de obra hasta alcanzar una cifra razonable que se estableció en una media anual del 10% respecto del presupuesto de adjudicación. La evolución positiva de este parámetro viene dada tanto por el esfuerzo técnico y de gestión de la Administración, como por la colaboración eficaz de las asistencias técnicas y de las empresas constructoras. En el año 2007 dicha desviación se ha situado en el 5,98%, tal y como se puede comprobar en los datos que aquí se ofrecen, lo cual representa tanto el cumplimiento del objetivo marcado como la buena gestión de los presupuestos destinados a ejecución de obra. El resumen de la evolución de este indicador se recoge en la tabla y en el gráfico siguientes:

Año	Presupuesto de Adjudicación de obra (euros)	Importe Liquidaciones de obra (euros)	Desviación media anual
1996	83.793.037	115.400.611	37,72%
1997	71.067.302	81.116.056	14,14%
1998	61.918.327	65.028.144	5,02%
1999	85.108.614	90.942.714	6,85%
2000	78.266.521	84.774.512	8,32%
2001	55.059.987	58.543.502	6,33%
2002	51.660.596	54.932.523	6,33%
2003	41.564.975	42.234.944	1,61%
2004	160.564.041	178.243.062	11,01%
2005	117.925.503	128.379.863	8,87%
2006	48.559.996	50.185.513	3,35%
2007	137.732.630	145.969.506	5,98%



Departamento de Obras Públicas, transportes y comunicaciones, Gobierno de Navarra
Desviación media anual de liquidaciones por obra

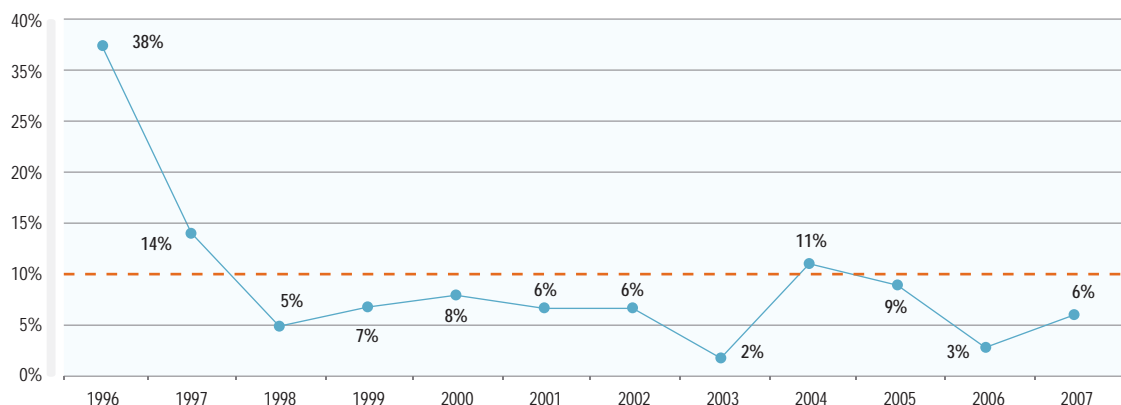



Es significativo reseñar que de los 70 expedientes de obras liquidados en el 2007, tan sólo 2 han rebasado el 10% de liquidación unitaria, mientras que los 68 contratos restantes se han liquidado con una desviación final cada uno de ellos inferior al 10%.

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Más del 10% de desviación final	14	14	5	14	9	10	3	3	10	7	1	2
Menos del 10% de desviación final	78	123	87	139	102	151	120	52	58	71	58	68
Total contratos de obra liquidados	92	137	92	153	111	161	123	55	68	78	60	70

- *A lo largo de los últimos 11 años, entre 1997 y 2007, periodo en el que se ha desarrollado este procedimiento de control de las desviaciones finales de obra, se ha liquidado un importe total de 909.428.492 euros con una desviación media final del 7,80%* ●

NOTA: Consultar la relación completa de obras y asistencias adjudicadas y liquidadas en 2007 en el Anejo Estadístico.
