



**Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua**

**DEPARTAMENTO DE
COHESIÓN TERRITORIAL**

**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURAS**

**INFORME ANUAL SOBRE LA ADJUDICACIÓN
Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS**

AÑO 2024

31 de enero de 2025

INFORME ANUAL SOBRE LA ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

ÍNDICE

Página

PRESENTACIÓN	3
I.- Nº DE CONTRATOS ADJUDICADOS Y LIQUIDADOS	4
II.- EVOLUCIÓN DE LAS ADJUDICACIONES DE OBRAS	5
III.- VOLUMEN ADJUDICADO EN EL PERIODO 2014-2023	6
IV.- BAJA MEDIA ANUAL DE ADJUDICACIONES DE OBRAS	6
V.- DESVIACIÓN MEDIA ANUAL DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS	7
INFORME SOBRE ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS Y ASISTENCIAS	10
EVOLUCIÓN DE MAGNITUDES CONJUNTAS DE OBRAS Y ASISTENCIAS. (Total Contratos)	11
ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS Y ASISTENCIAS 2023. DISTRIBUCIÓN POR SERVI.....	13
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN TOTAL. DISTRIBUCIÓN POR SERVICIOS.	14
RESUMEN GENERAL - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS.....	16
EVOLUCIÓN DE MAGNITUDES DE CONTRATOS DE OBRAS	17
EVOLUCIÓN DE MAGNITUDES DE CONTRATOS DE ASISTENCIAS	19
RELACIÓN COMPLETA DE OBRAS ADJUDICADAS 2023	20
RELACIÓN COMPLETA DE OBRAS LIQUIDADAS 2023	22
RESUMEN DE DIFERENCIAS LIQUIDACIÓN / ADJUDICACIÓN OBRAS	24
RELACIÓN COMPLETA DE ASISTENCIAS ADJUDICADAS 2023	26
RELACIÓN COMPLETA DE ASISTENCIAS LIQUIDADAS 2023	28
RESUMEN DE DIFERENCIAS LIQUIDACIÓN / ADJUDICACIÓN ASISTENCIAS	30



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS

INFORME ANUAL 2024 ADJUDICACIONES Y LIQUIDACIONES DE OBRAS Y ASISTENCIAS

Después de un año de esfuerzo, se presenta el “Informe Anual 2024” de la Dirección General Obras Públicas e Infraestructuras del Departamento de Cohesión Territorial. Este documento incluye un análisis detallado y datos sobre las Adjudicaciones y Liquidaciones de Obras y Asistencias Técnicas realizadas durante el año 2024. Uno de los aspectos más destacados de este informe es la Desviación Media Anual de las obras liquidadas por la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, así como su evolución en los últimos años.

Uno de los principales objetivos es lograr una reducción significativa de los costes finales de las obras en comparación con sus precios de adjudicación, lo que ha motivado la creación de este Informe Anual como una herramienta para el control de la gestión. A continuación, se presentan los resultados y cifras más relevantes, que forman parte integral del documento, junto con toda la información recopilada a lo largo de 2024 sobre adjudicaciones y liquidaciones de obras y asistencias técnicas de esta Dirección General.



RESULTADOS 2024	
ADJUDICACIONES Y LIQUIDACIONES DE OBRAS 2015 - 2024	
VOLUMEN DE OBRA ADJUDICADO EN 2024	117.630.936,04
VOLUMEN DE OBRA LIQUIDADA EN 2024	42.786.854,40
DESVIACIÓN-INCREMENTO MEDIO OBRAS LIQUIDADAS 2024	3,33%
Nº DE CONTRATOS CON DESVIACIÓN-INCREMENTO EN LIQUIDACIÓN SUPERIOR AL 10 % EN 2024	1
Nº DE CONTRATOS CON DESVIACIÓN-INCREMENTO EN LIQUIDACIÓN INFERIOR AL 10 % EN 2024	10
VOLUMEN DE OBRA ADJUDICADA EN EL PERIODO 2015-2024	610.861.018,13
VOLUMEN DE OBRA LIQUIDADA EN EL PERIODO 2015-2024	511.796.197,21
DESVIACIÓN-INCREMENTO MEDIO EN LAS LIQUIDACIONES DE OBRA EN EL PERIODO 2015-2024	2,94%

I. NÚMERO DE CONTRATOS ADJUDICADOS Y LIQUIDADOS

El número total de contratos, adjudicados y liquidados a lo largo del año 2024, tanto de obras, como de asistencias técnicas, refleja una parte de la actividad desarrollada por la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras.


En la siguiente tabla se muestra la evolución de estas cifras totales durante los últimos años:



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nº Contratos Adjudicados	32	24	40	40	31	24	51	21	21	31
Nº Contratos Liquidados	29	30	33	41	26	26	39	20	20	29

II. EVOLUCIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS

ADJUDICACIONES DE OBRA	
AÑO	IMPORTE (Euros)
2015	76.422.915
2016	7.311.705
2017	16.564.031
2018	58.703.366
2019	98.560.134
2020	10.219.928
2021	110.538.133
2022	29.992.559
2023	84.916.724
2024	117.630.936

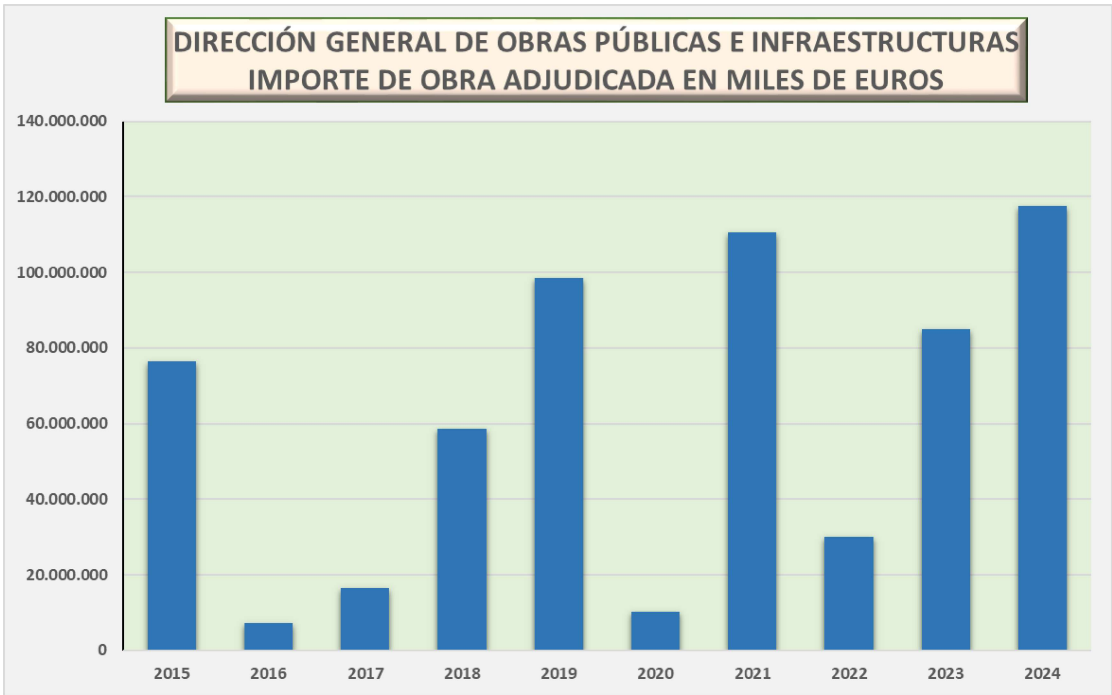




III. VOLUMEN ADJUDICADO EN EL PERIODO 2015 – 2024

El importe total de contratación de obras tramitadas por la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, en los últimos diez años (2015-2024), ha ascendido a **626.595.979,90 €**.

IV. BAJA MEDIA ANUAL DE ADJUDICACIONES DE OBRAS

La **Baja Media Anual en las Adjudicaciones** de obra es, asimismo, un dato representativo de la gestión de la contratación. Se obtiene comparando el total de Presupuesto Adjudicado de la obra con el Presupuesto del Proyecto aprobado por la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras (Presupuesto de licitación). Los datos referentes a esta Baja Media Anual son los siguientes:

AÑO	BAJA MEDIA ANUAL DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS (%)
2015	-11,94 %
2016	-15,75 %
2017	-27,79 %
2018	-15,00 %
2019	-12,87 %
2020	-21,54 %
2021	-12,80 %
2022	-2,53 %
2023	-19,02 %
2024	-0,26 %

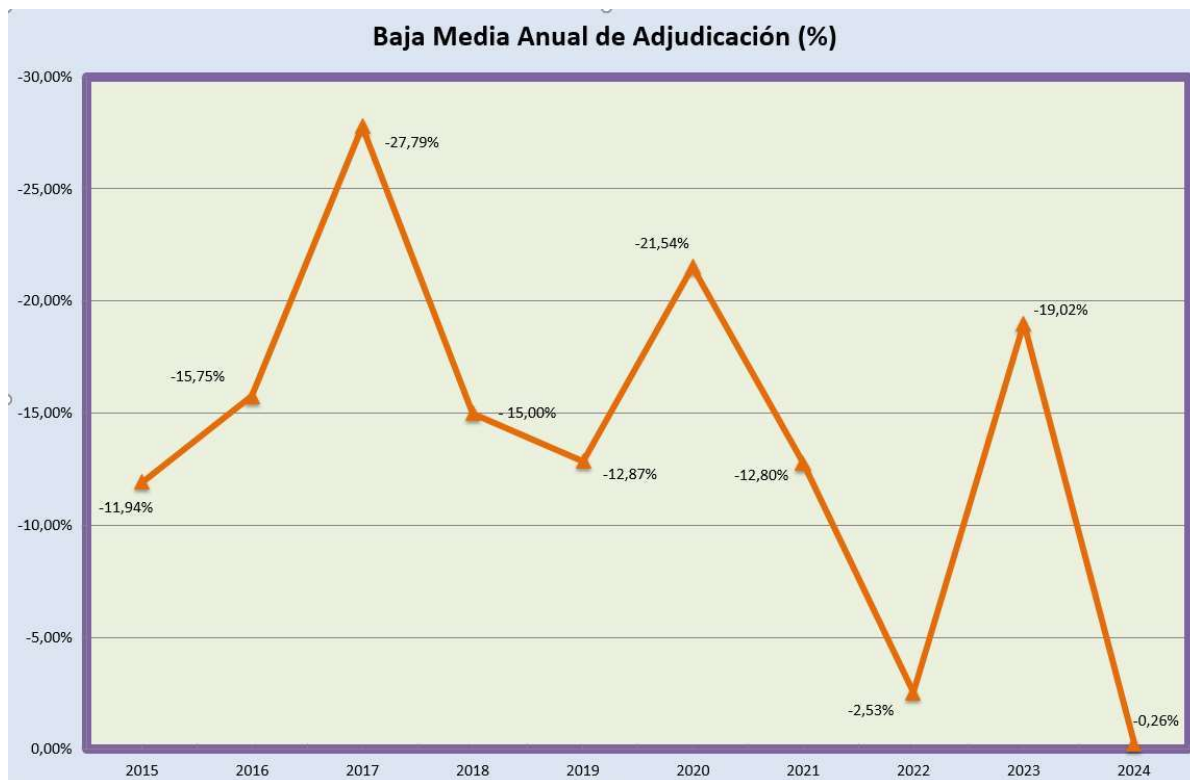

V. DESVIACIÓN MEDIA ANUAL DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS

La desviación media anual es, sin lugar a dudas, uno de los indicadores más significativos en la gestión administrativa de los contratos de obra. El objeto establecido es mantener esta desviación por debajo del 10% en relación con los presupuestos de adjudicación. Sin embargo, tras varios años de evolución positiva, la crisis provocada por la guerra de Rusia y Ucrania ha generado un notable encarecimiento en los costos de las obras. Este aumento se ha visto reflejado en la desviación media anual, especialmente debido a la necesidad de revisar los precios en números proyectos. Es fundamental abordar esta situación con estrategias adecuadas para mitigar el impacto y asegurar una gestión eficiente y responsable de los recursos públicos.



La evolución de este indicador se presenta de manera clara en la tabla y el gráfico adjunto. Según los datos, **en el año 2024** se ha observado una **desviación media anual del 3,33%** en los contratos de obra, en comparación con los importes de adjudicación. Este resultado refleja un desempeño positivo y se encuentra muy por debajo del umbral del 10% establecido como objetivo, lo que indica una gestión eficiente en la administración de los recursos destinados a estos proyectos

AÑO	PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN DE OBRA (EUROS)	IMPORTE LIQUIDACIONES DE OBRA (EUROS)	DESVIACION MEDIA ANUAL
2015	98.658.590,39	98.609.895,61	0,05%
2016	23.303.787,19	23.518.586,20	0,92%
2017	9.041.537,18	9.025.273,09	-0,18%
2018	33.867.101,67	32.766.754,63	-3,25%
2019	81.238.073,40	81.285.488,98	0,06%
2020	18.409.385,48	18.807.344,30	2,16%
2021	49.084.245,55	49.041.274,24	0,09%
2022	36.065.539,01	38.015.908,83	5,41%
2023	106.142.814,63	117.896.175,39	11,07 %
2024	41.409.224,51	42.786.854,40	3,33%





Este año, controlando la desviación, **sólo 1 de los expedientes de contratación de obras liquidados en el 2024, ha rebasado el 10 % de desviación final.**

A lo largo de los diez últimos años, entre 2015 y 2024, se ha liquidado un importe total de **511.796.197,21 euros con una desviación media final del 2,94 %**



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

INFORME SOBRE LA ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS Y ASISTENCIAS

AÑO 2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS

EVOLUCIÓN DE MAGNITUDES CONJUNTAS DE OBRAS Y ASISTENCIAS (TOTAL CONTRATOS)

RESUMEN 2024

Número de contratos adjudicados y liquidados

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nº Contratos Adjudicados	32	24	40	40	31	24	51	21	21	32
Nº Contratos Liquidados	29	30	33	41	26	26	39	20	20	29

Contratos Adjudicados:

Presupuestos de Licitación/Adjudicación y Baja media anual de adjudicación (en millones de euros)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Presupuestos licitación	89,548	9,755	25,281	76,974	115,924	16,101	130,993	33,696	110,915	134,247
Presupuestos adjudicación	78,647	8,259	18,609	66,458	100,936	12,796	114,166	32,485	90,250	132,468
Baja %	-12,17%	-15,34%	-26,39%	-13,66%	-12,93%	-20,52%	-12,85%	-3,59%	-18,63%	-1,32%

Contratos Liquidados:

Presupuestos de Adjudicación / Liquidación y Desviación Media Anual (en millones de euros)


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Presupuestos adjudicación	101,920	24,635	11,186	41,415	82,470	19,897	50,226	37,672	106,543	53,717
Presupuestos liquidación	101,833	24,821	11,564	40,592	82,504	20,276	50,226	39,616	118,280	54,988
Desviación en liquidación	-0,09%	+0,76%	+3,37%	-1,99%	+0,04%	+1,91%	0,00%	5,16%	+11,02%	+2,37%

Contratos Adjudicados:


Porcentaje de Sistemas de Adjudicación

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mejor Calidad-precio	97,06%	83,30%	70,10%	69,64%	70,73%	79,53%	94,84%	96,64%	97,03%	98,78%
Precio ofertado	1,48%	7,33%	20,56%	10,20%	15,15%	12,74%	3,05%	1,15%	0,00%	0,00%
Proc. Negociado	0,66%	1,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Encargos	0,81%	7,91%	6,22%	20,16%	5,11%	7,73%	0,94%	2,21%	1,21%	0,61%
Emergencias	0,00%	0,00%	3,13%	0,00%	9,01%	0,00%	1,16%	0,00%	1,76%	0,60%


DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS
BAJA MEDIA ANUAL DE ADJUDICACIONES DE CONTRATOS

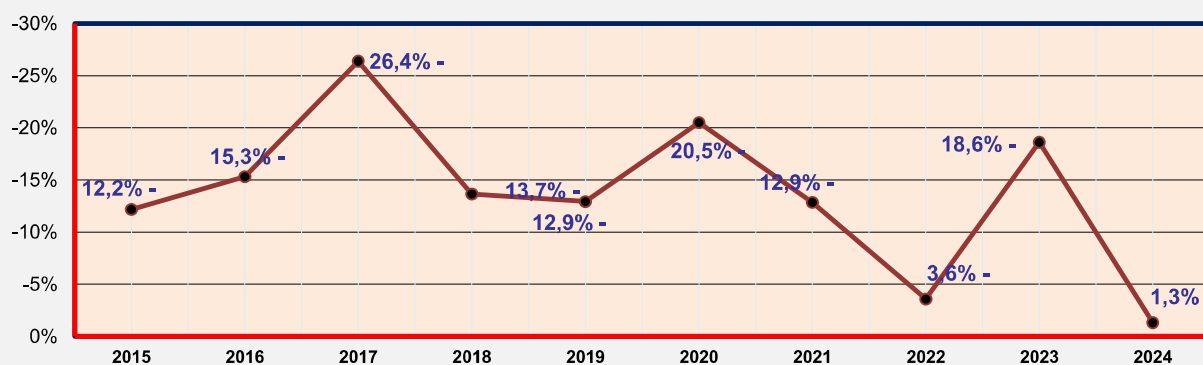

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS
PRESUPUESTO ADJUDICADO POR SISTEMA DE ADJUDICACIÓN

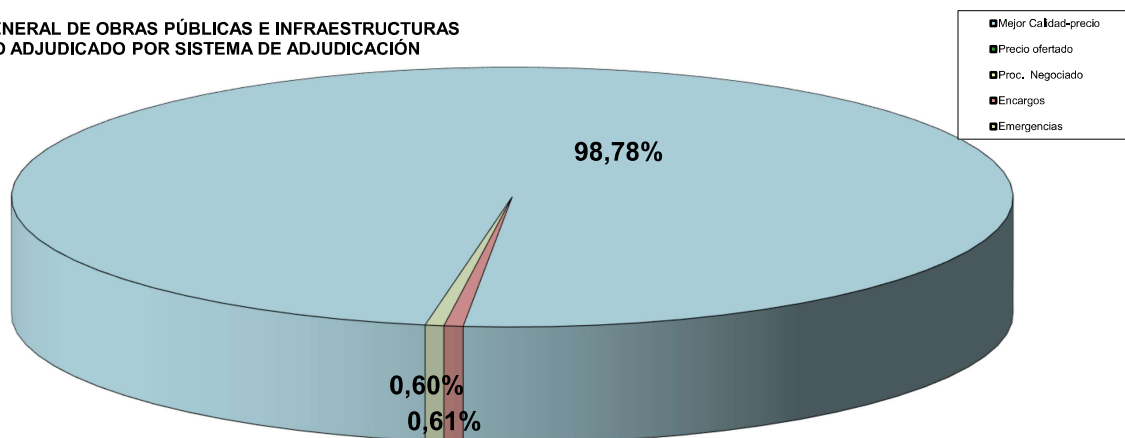

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO ADJUDICADO POR SISTEMA DE ADJUDICACIÓN

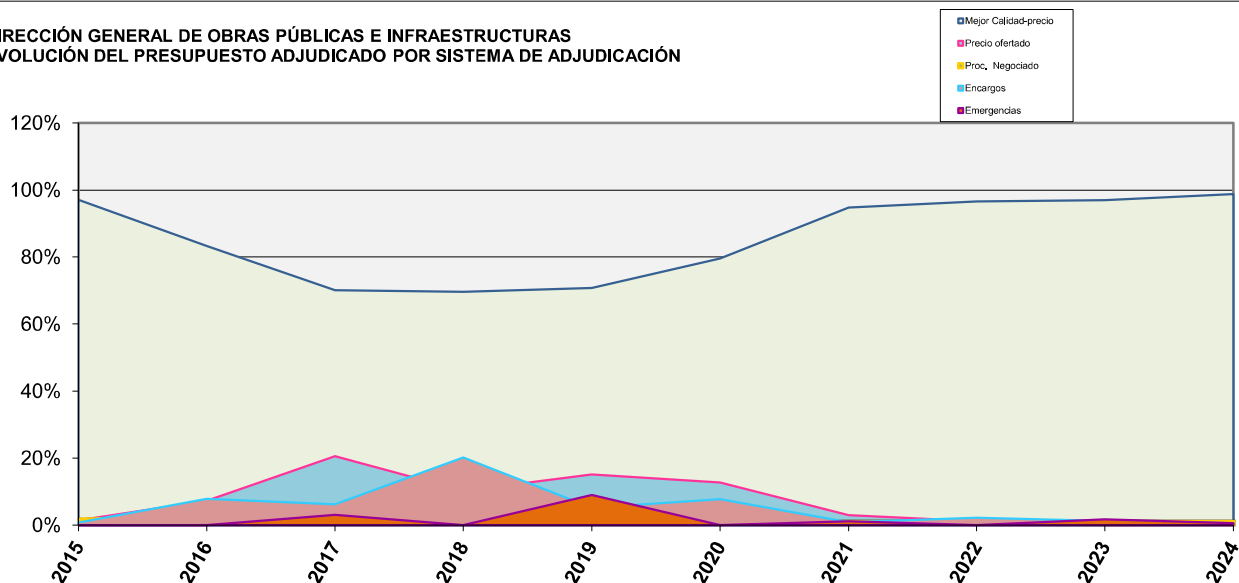

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS

ADJUDICACIONES Y LIQUIDACIONES DE OBRAS Y ASISTENCIAS EN EL AÑO 2024 DISTRIBUCIÓN POR SERVICIOS

I OBRAS

<u>ADJUDICACIONES</u>	OBRAS ADJUDICADAS AÑO 2024			
	Nº OBRAS ADJUDIC.	SUMA PRESUPUESTOS LICITACIÓN	SUMA PRESUPUESTOS ADJUDICACIÓN	BAJA MEDIA REGISTRADA
N. INFRAESTRUCTURAS	3	7.150.998	6.839.638	- 4,35%
CONSERVACION	12	110.791.298	110.791.298	+ 0,00%
PROYECTOS	0	-	-	+ 0,00%
TOTAL	15	117.942.297	117.630.936	- 0,26%

<u>LIQUIDACIONES</u>	OBRAS LIQUIDADAS AÑO 2024			
	Nº OBRAS LIQUIDADAS	SUMA PRESUPUESTOS ADJUDICACIÓN	SUMA PRESUPUESTOS LIQUIDACIÓN	DIFERENCIA % LIQUIDACIÓN ADJUDICACIÓN
N. INFRAESTRUCTURAS	4	29.824.926	31.202.721	+ 4,62%
CONSERVACION	7	11.584.298	11.584.133	- 0,00%
PROYECTOS	0	-	-	+ 0,00%
TOTAL	11	41.409.225	42.786.854	+ 3,33%

II ASISTENCIAS

<u>ADJUDICACIONES</u>	ASISTENCIAS ADJUDICADAS AÑO 2024			
	Nº ASISTENCIAS ADJUDIC.	SUMA PRESUPUESTOS LICITACIÓN	SUMA PRESUPUESTOS ADJUDICACIÓN	BAJA MEDIA REGISTRADA
AÑO 2021				
N. INFRAESTRUCTURAS	0	-	-	+ 0,00%
CONSERVACION	6	14.745.095	13.396.789	- 9,14%
PROYECTOS	11	1.559.462	1.440.455	- 7,63%
TOTAL	17	16.304.557	14.837.244	- 9,00%

<u>LIQUIDACIONES</u>	ASISTENCIAS LIQUIDADAS AÑO 2024			
	Nº ASISTENCIAS LIQUIDADAS	SUMA PRESUPUESTOS ADJUDICACIÓN	SUMA PRESUPUESTOS LIQUIDACIÓN	DIFERENCIA% LIQUIDACIÓN ADJUDICACIÓN
N. INFRAESTRUCTURAS	0	-	-	+ 0,00%
CONSERVACIÓN	7	9.178.519	9.338.918	+ 1,75%
PROYECTOS	5	2.514.093	2.332.335	- 7,23%
TOTAL	12	11.692.612	11.671.253	- 0,18%

DEPARTAMENTO DE COHESIÓN TERRITORIAL

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN TOTAL DE CONTRATOS

DISTRIBUCIÓN POR SERVICIOS

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN APLICADOS EN EL AÑO 2024


PROCEDIMIENTO	SERVICIO DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS			SERVICIO DE CONSERVACIÓN			SERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		
	Nº	Suma		Nº	Suma		Nº	Suma	
	Cont.	Presupuestos	%	Cont.	Presupuestos	%	Cont.	Presupuestos	%
Mejor calidad-precio	3	6.839.638	100,00%	17	123.403.789	99,37%	4	610.610	42,39%
Precio ofertado	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Negociado	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Encargo	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	814.547	56,55%
Emergencia	0	0	0,00%	1	784.298	0,63%	1	15.298	1,06%
TOTAL	3	6.839.638	100,00%	18	124.188.087	100,00%	11	1.440.455	100,00%

TOTALES


PROCEDIMIENTO	Nº	Suma	
	Cont.	Presupuestos	%
Mejor calidad-precio	24	130.854.036	98,78%
Precio ofertado	0	0	0,00%
Negociado	0	0	0,00%
Encargo	6	814.547	0,61%
Emergencia	2	799.596	0,60%
TOTAL	32	132.468.180	100%

132.468.180

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR SERVICIOS

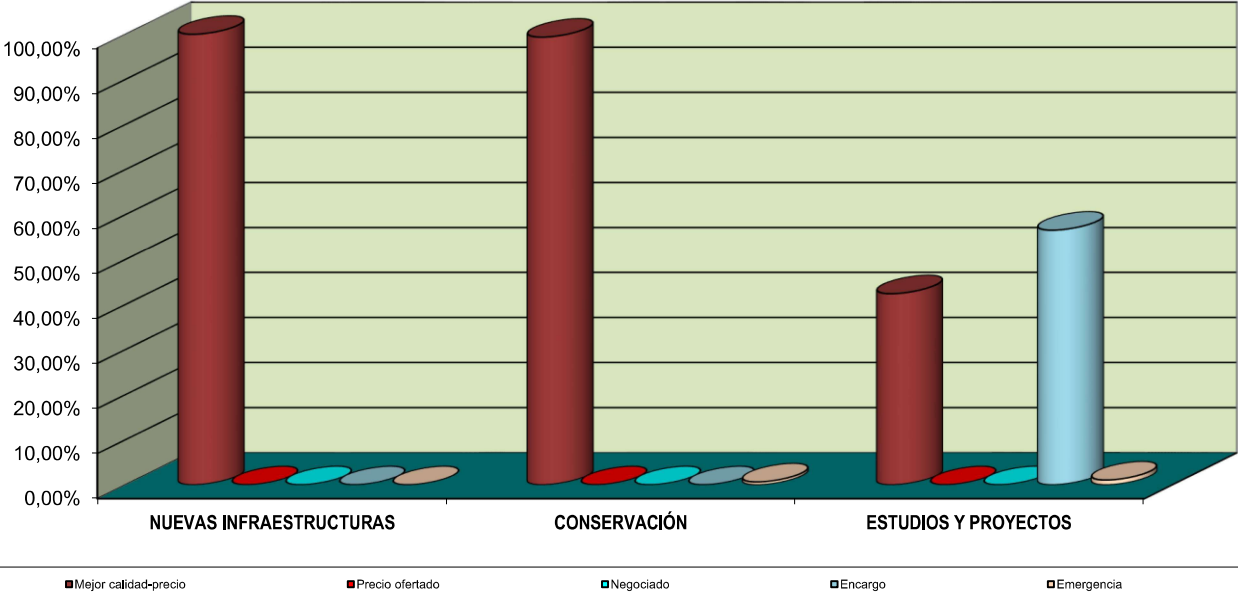

TOTAL CONTRATOS ADJUDICADOS POR SERVICIOS

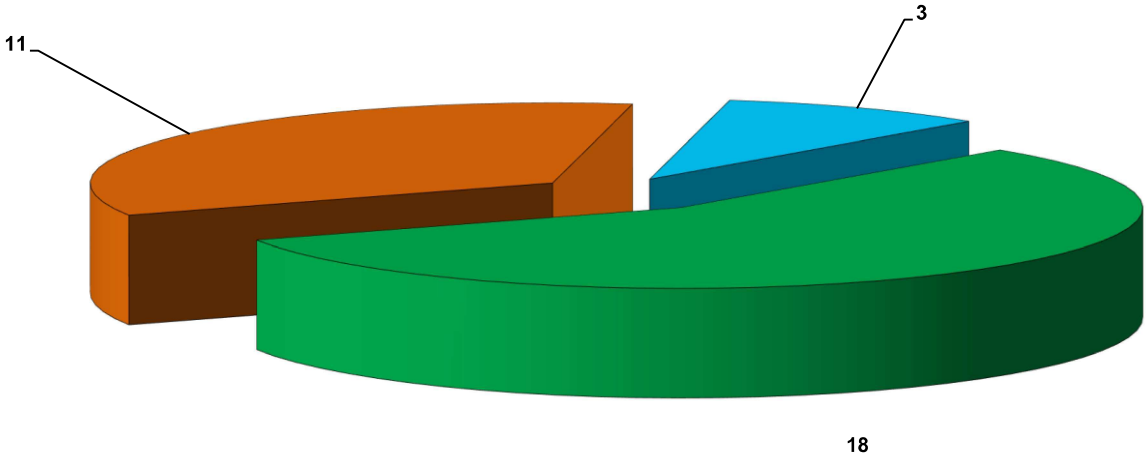


SERV. NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

SERV. CONSERVACIÓN

SERV. ESTUDIOS Y PROYECTOS

TOTAL PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN POR SERVICIOS

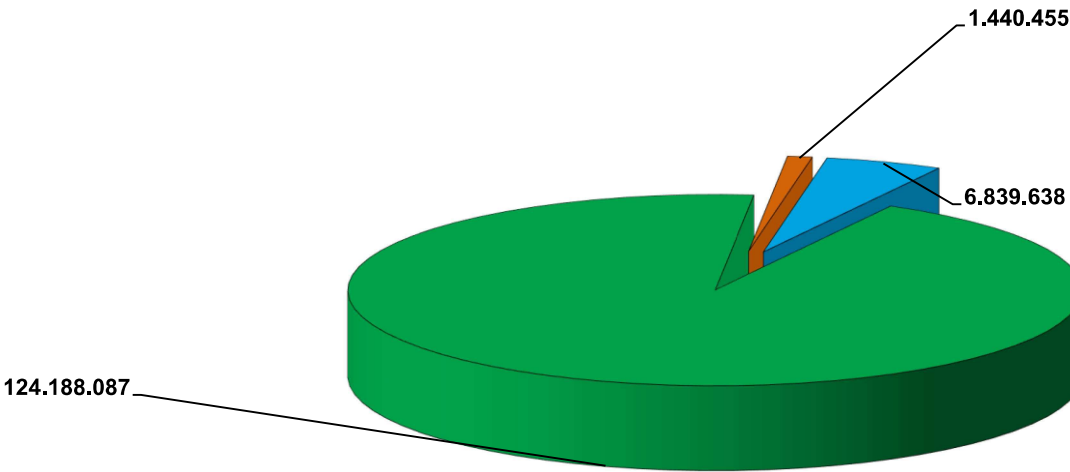

SERV. NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

SERV. CONSERVACIÓN

SERV. ESTUDIOS Y PROYECTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

RESUMEN GENERAL ADJUDICACIONES Y LIQUIDACIONES DE CONTRATOS DE OBRAS Y ASISTENCIAS

AÑO 2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS

EVOLUCIÓN DE MAGNITUDES DE CONTRATOS DE OBRAS

AÑO 2024

Número de obras adjudicadas y liquidadas

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nº Obras Adjudicadas	14	6	21	22	17	7	44	7	8	15
Nº Obras Liquidadas	15	14	15	20	17	9	28	14	15	11

Obras Adjudicadas:

Presupuestos de Licitación/Adjudicación y Baja Media Anual de Adjudicación (en millones de euros)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Presupuestos Licitación	86,785	8,678	22,939	69,059	113,116	13,025	126,767	30,772	104,855	117,942
Presupuestos adjudicación	76,423	7,312	16,564	58,703	98,560	10,220	110,538	29,993	84,917	117,631
Baja Media Anual de Adjudicación (%)	- 11,94%	- 15,75%	- 27,79%	- 15,00%	- 12,87%	- 21,54%	-12,80%	- 2,53%	- 19,02%	- 0,26%

Obras Adjudicadas:

Porcentaje de Sistemas de Adjudicación (sobre el total de presupuesto adjudicado) (en millones de euros)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mejor calidad-precio	97,55%	92,50%	71,44%	78,79%	95,54%	82,34%	95,00%	100,00%	98,35%	99,34%
Precio oferta	1,82%	7,38%	26,02%	12,24%	3,14%	17,66%	3,94%	0,00%	0,00%	0,00%
Proc. Negociado	0,63%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Encargos	0,00%	0,00%	0,00%	8,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%
Emergencias	0,00%	0,00%	2,54%	0,00%	1,31%	0,00%	1,05%	0,00%	1,53%	0,66%

Obras Liquidadas:





Presupuestos de Adjudicación / Liquidación y Desviación Final de Obras (en millones de euros)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Presupuestos adjudicación	98,659	23,304	9,042	33,867	81,238	18,409	49,041	36,066	106,143	41,409
Presupuestos liquidación	98,610	23,519	9,025	32,767	81,285	18,807	49,084	38,016	117,896	42,787
Desviación Final de Obras (%)	- 0,05%	+ 0,92%	- 0,18%	- 3,25%	+ 0,06%	+ 2,16%	0,09%	+ 5,41%	+ 11,07%	+ 3,33%

Obras Liquidadas:

Número de obras según su desviación final de obra

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Más del 10% de desviación final de obra	1	0	0	0	0	1	1	1	6	1
Menos del 10% de desviación final de obra	15	14	15	20	17	8	27	13	9	10

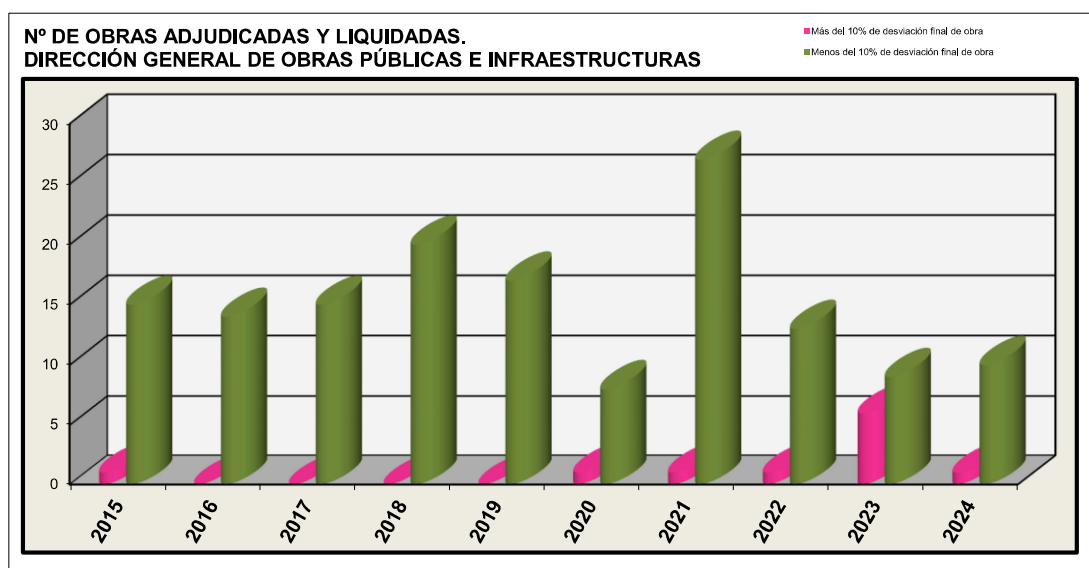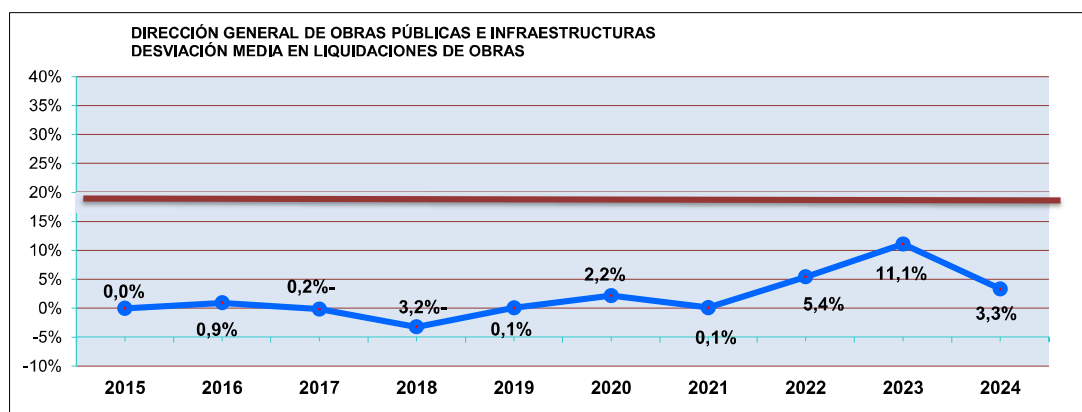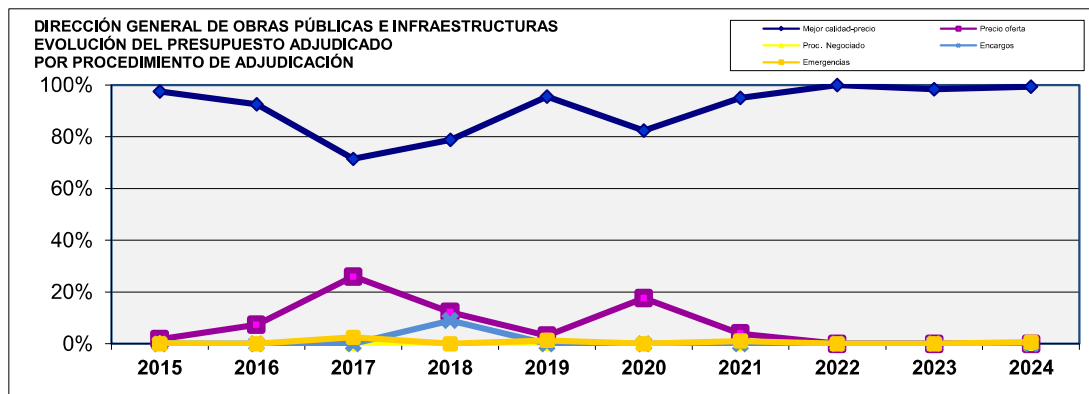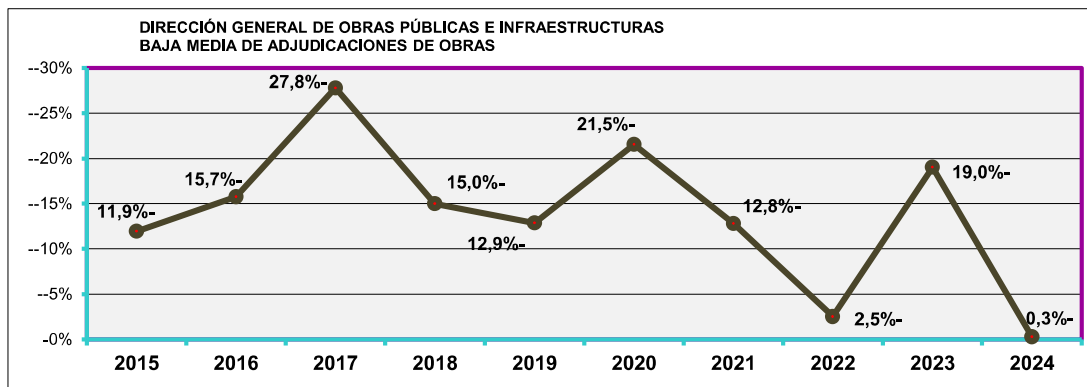


DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS

EVOLUCIÓN DE MAGNITUDES DE CONTRATOS DE ASISTENCIAS

AÑO 2024


Número de Asistencias Adjudicadas

	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nº Asistencias Adjudicadas	18	18	19	19	18	14	17	7	14	13	17
Nº Asistencias Liquidadas	14	16	18	18	21	9	17	11	6	5	18

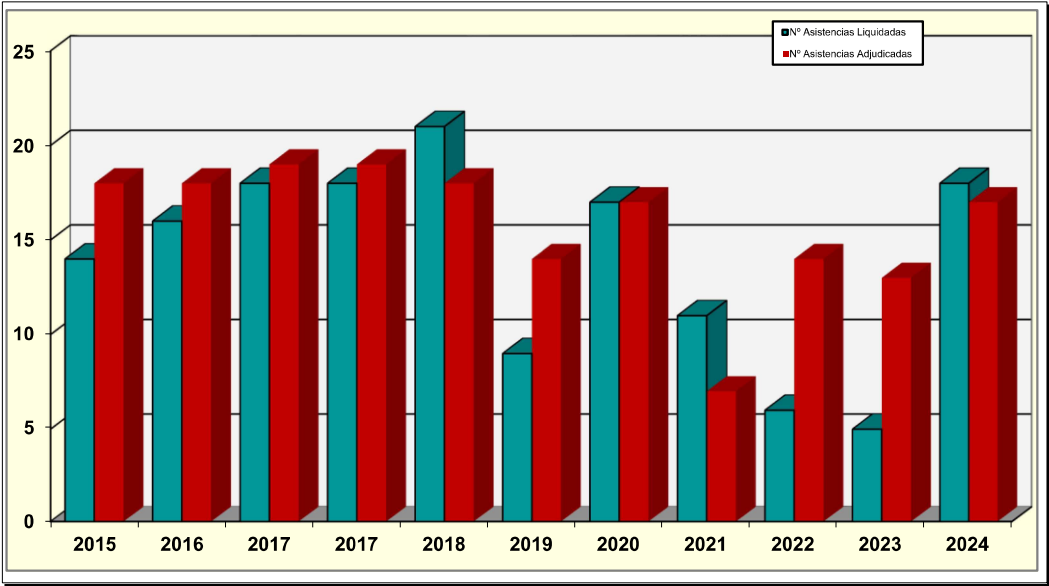

Presupuestos de Licitación/Adjudicación y Baja Media Anual de Adjudicación (en millones de euros)

	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Presupuestos de licitación	2,763	1,076	2,343	2,343	7,915	2,808	3,076	4,226	10,022	6,060	16,305
Presupuestos de adjudicación	2,224	0,947	2,045	2,045	7,755	2,376	2,577	3,628	9,590	5,334	14,837
Baja media anual de adjudicación (%)	-19,51%	-12,00%	-12,73%	-12,73%	-2,02%	-15,39%	-16,23%	-14,15%	-4,31%	-11,98%	-9,00%

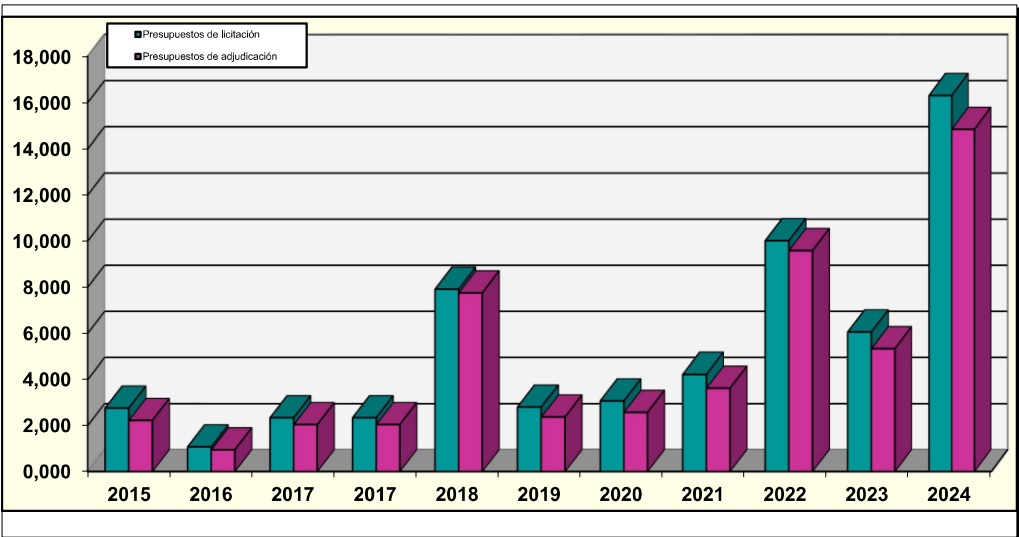

I

**RELACIÓN COMPLETA DE OBRAS ADJUDICADAS
AÑO 2024**

RELACIÓN COMPLETA DE OBRAS ADJUDICADAS EN 2024

Nº	OBRA	FECHA ADJUDICACIÓN	CONTRATISTA ADJUDICATARIO	PRESUPUESTO LICITACIÓN	PRESUPUESTO ADJUDICACIÓN	% BAJA
1	Rehabilitación de daños sufridos en la Autovía del Norte A-1, p.k. 396+000 sentido Alsasu/Alsasua, por fuertes lluvias del 26-02-2024	12-03-24	Excavaciones Fermín Osés, SL	784.298,27	784.298,27	0,00%
2	Itinerario peatonal y ciclista de conexión entre Sarriguren-Ciudad de la Innovación-Ripagaina-Areta-Burlada	25-04-24	Construcciones Mariezcurrena, SL	1.748.560,19	1.904.182,05	8,90%
3	Conservación integral de las carreteras del Centro de Conservación de Pamplona, 2024-2027	21-06-24	Const. Mariezcurrena / Obras y Prepar. de Terrenos	18.855.000,00	18.855.000,00	0,00%
4	Conservación integral de las carreteras del Centro de Conservación de Aoiz, 2024-2027	21-06-24	Serveo Infraest.SAU / Lakita SA	22.653.000,00	22.653.000,00	0,00%
5	Conservación integral de las carreteras del Centro de Conservación de Estella-Lizarra, 2024-2027	21-06-24	Excavaciones Fermín Osés, SL	18.180.000,00	18.180.000,00	0,00%
6	Conservación integral de las carreteras del Centro de Conservación de Tafalla, 2024-2027	21-06-24	Sacyr, SA / Erriberri, SL	18.684.000,00	18.684.000,00	0,00%
7	Conservación integral de las carreteras del Centro de Conservación de Tudela, 2024-2027	21-06-24	Sacyr, SA / Erriberri, SL	20.835.000,00	20.835.000,00	0,00%
8	Proyecto Constructivo del nuevo vial de conexión de Barañain con la carretera NA-30 en Landaben	4-07-24	Obras Especiales Edificación e Infraestructuras, SA	3.491.107,06	3.215.257,75	-7,90%
9	Rehabilitación de firme en las carreteras del centro de conservación de Aoiz, 2024	11-09-24	Asfaltos Biurrun, S.A.	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00%
10	Rehabilitación de firme en autovías del centro de conservación de Irurtzun, 2024	11-09-24	Viaría Aglomerado, S.L.	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00%
11	Rehabilitación de firme en las carreteras del centro de conservación de Tudela, 2024	11-09-24	Excavaciones Erri Berri, S.L.	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00%
12	Rehabilitación de firmes II en las carreteras del centro de conservación de Pamplona, 2024	24-10-24	Viaría Aglomerado, S.L.	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00%
13	Rehabilitación de firmes II en las carreteras del centro de conservación de Estell-Lizarra, 2024	24-10-24	Asfaltados del Ebro, SL	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00%
14	Rehabilitación de firmes II en las carreteras del centro de conservación de Tafalla, 2024	24-10-24	Asfaltados Biurrun, SA	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00%
15	Itinerario peatonal y ciclista de conexión por la ruta Camino de Santiago entre Pamplona y Cizur Menor-NextGenerationEU	23-12-24	Obras Especiales Edificación e Infraestructuras, S.A.U.	1.911.331,03	1.720.197,97	-10,00%
SUMAS Y VALORES MEDIOS				117.942.296,55	117.630.936,04	-0,26%

SERVICIO PROMOTOR	
NI	NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
CO	CONSERVACIÓN
PR	ESTUDIOS Y PROYECTOS

SISTEMA DE ADJUDICACIÓN	
EN	Encargo a Empresas Públicas
PN	Procedimiento Negociado
EM	Emergencia

I

RELACIÓN COMPLETA DE OBRAS LIQUIDADAS 2024

RELACIÓN COMPLETA DE OBRAS LIQUIDADAS EN 2024


Nº	OBRA	FECHA LIQ.	CONTRATISTA ADJUDICATARIO	PRESUPUESTO ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO LIQUIDACIÓN	%
1	Conversión de la Ctra. N-121-A en vía 2+1 entre el PK 40+900 al PK 52+340 (boca sur túnel de Arrigatzelu)	12-02-24	Obras Especiales,Edificación e Infraestructuras, SAU	20.964.177,55	21.709.327,73	+ 3,55%
2	Intersección NA-30 en el Polígono Industrial Landaben (Navarra)	18-04-24	Lacunza Hermanos, S.L.	156.304,33	170.046,36	+ 8,79%
3	Conversión de la Ctra. N-121-A en vía 2+1 entre el PK 5+550 (glorieta de los túneles de Ezcaba) y el PK 10+500 (travesía de Olave)	19-04-24	UTE Accioa Construcción,SA./Excav, Fermín Osés, SL	8.143.529,77	8.651.403,45	+ 6,24%
4	Nuevo acceso desde Elizondo a la ctra N-121-B, pk 50+040 M.I.	8-05-24	Obras Especiales Edificación e Infraestructuras, S.I.	560.914,59	671.943,66	+ 19,79%
5	Rehabilitación de daños sufridos en la Autovía del Norte A-1, p.k. 396+000 sentido Altsasu/Alsasua, por fuertes lluvias del 26-02-2024	12-03-24	Excavaciones Fermín Osés, SL	784.298,27	784.298,27	0,00%
6	Rehabilitación de firme en las carreteras del centro de conservación de Aoiz, 2024	4-12-24	Asfaltos Biurrun, SA	1.800.000,00	1.799.959,19	0,00%
7	Rehabilitación de firme en las carreteras del centro de conservación de Tudela 2024	19-12-24	Excavaciones Erri-Berri, SL	1.800.000,00	1.799.925,79	0,00%
8	Rehabilitación de firme en autovías del centro de conservación de Iruztzun, 2024	19-12-24	Viaria Aglomerado, SL	1.800.000,00	1.799.997,98	0,00%
9	Rehabilitación de firme II en las carreters del centro de conservación de Estella-Lizarra, 2024	19-12-24	Asfaltados del Ebro, SL	1.800.000,00	1.799.999,99	0,00%
10	Rehabilitación de firme II de varias carreteras del centro de conservación de Pamplona, 2024	30-12-24	Viaria Aglomerado, SL	1.800.000,00	1.799.958,09	0,00%
11	Rehabilitación de firme II en las carreteras del centro de conservación de Tafalla, 2024	13-12-24	Asfaltados Biurrun, SA	1.800.000,00	1.799.993,89	- 0,00%
SUMAS Y VALORES MEDIOS				41.409.224,51	42.786.854,40	+ 3,33%

SERVICIO PROMOTOR	
NI	NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
CO	CONSERVACIÓN
PR	ESTUDIOS Y PROYECTOS

**RESUMEN DE DIFERENCIAS LIQUIDACIÓN /
ADJUDICACIÓN DE OBRAS 2024**

AÑO 2024

DIFERENCIA LIQUIDACION / ADJUDICACIÓN	Nº DE OBRAS	%	SUMAS DE PRESUPUESTOS ADJUDICACIÓN	%
> 50 %	0	0,00%	-	0,00%
40 % a 50 %	0	0,00%	-	0,00%
30 % a 40 %	0	0,00%	-	0,00%
20 % a 30 %	0	0,00%	-	0,00%
10 % a 20 %	1	9,09%	560.914,59	1,35%
0 % a 10 %	3	27,27%	29.264.011,65	70,67%
0 %	7	63,64%	11.584.298,27	27,98%
- 10 % a 0 %	0	0,00%	-	0,00%
-20 % a - 10 %	0	0,00%	-	0,00%
< - 20 %	0	0,00%	-	0,00%
TOTALES	11	100,00%	41.409.224,51	100,00%

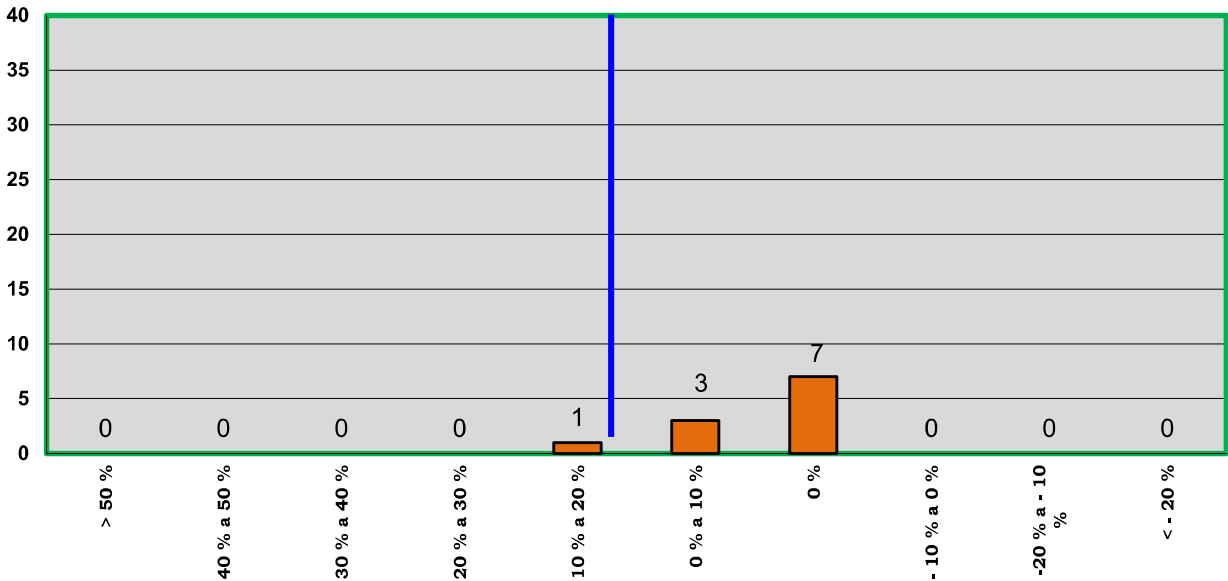

RESUMEN

DIFERENCIA LIQUIDACIÓN / ADJUDICACIÓN	Nº DE OBRAS	%	SUMAS DE PRESUPUESTOS ADJUDICACIÓN	%
MAYOR DE 10 %	1	9,09%	560.914,59	1,35%
MENOR DE 10 %	10	90,91%	40.848.309,92	98,65%
TOTALES	11	100,00%	41.409.224,51	100,00%

RELACIÓN COMPLETA DE ASISTENCIAS ADJUDICADAS 2024

RELACIÓN COMPLETA DE ASISTENCIAS ADJUDICADAS EN 2024

Nº	TRABAJO DE ASISTENCIA	FECHA ADJUDICACIÓN	CONTRATISTA ADJUDICATARIO	PRESUPUESTO LICITACIÓN	PRESUPUESTO ADJUDICACIÓN	% BAJA	SIST. ADJ.	SERVICIO
1	Asistencia a la Dirección de Explotación de la Autovía A-12 (Autovía del Camino de Santiago) años 2024-2027	22-02-24	LRA Infraestructures Consulting, SL	444.000,00	355.200,00	- 20,00%	CO	CO
2	Asistencia a la Dirección de Explotación de la Autovía A-21 (Autovía del Pirineo) años 2024-2027	22-02-24	LRA Infraestructures Consulting, SL	696.000,00	556.800,00	- 20,00%	CO	CO
3	Asistencia técnica en materia de seguridad y salud de los contratos de conservación de la DGOPI 2024-2025 -LOTE 1	1-02-24	Ingeniería y Prevención de Riesgos, S.L.	89.797,63	79.860,00	- 11,07%	CO	PH
4	Asistencia técnica en materia de seguridad y salud de los contratos de conservación de la DGOPI 2024-2025 -LOTE 2	1-02-24	Ingeniería y Prevención de Riesgos, S.L.	89.797,63	90.750,00	1,06%	CO	PH
5	Trabajos de vuelo fotogramétrico digital de 15 cm/píxel, apoyo de campo, aerotriangulación, modelos digitales de elevaciones y realización de la ortofotografía básica ... de todo el territorio de la CFN en el año 2024	2-05-24	Tracasa Instrumental, S.L.	296.539,70	296.539,70	+ 0,00%	EN	PH
6	Redacción de los Estudios de Seguridad Vial en la Red de Carreteras de Navarra, años 2024-2028	24-05-24	Alauda Ingeniería, SA y Applus Norcontrol, SLU	177.302,75	141.859,93	- 19,99%	CO	CO
7	Monitorización en tiempo real de los desplazamientos de la ladera de Cárcar	19-06-24	Leica Geosystems, SL	15.297,91	15.297,91	+ 0,00%	EM	PH
8	Proyecto constructivo de la 2ª y 3ª fase de la variante NA-4410 a su paso por Bera	25-10-24	SERTECNA, ANTA Ingeniería Civil y GEEA Geólogos	100.000,00	80.000,00	- 20,00%	CO	PH
9	Mantenimiento del Centro de Control de Conservación de Carreteras y los sistemas e instalaciones de él dependientes, 2024-2028	15-11-24	Serveo Servicios, S.A.U.	9.175.477,99	8.444.199,75	- 7,97%	CO	CO
10	Gestión del Centro de Control y Vigilancia de Incidencias de Seguridad Vial en la Red de Carreteras de Navarra, 2024-2028	15-11-24	Abertis Gestión Viaria, S.A.U	3.582.312,94	3.295.727,90	- 8,00%	CO	CO
11	Digitalización, georreferencia, ortofotos rápidas e incorporación a la fototeca de los negativos de vuelos históricos de distintos fecha y escalas del territorio de CFN	4-12-24	Tracasa Instrumental, S.L.	95.112,60	95.112,60	+ 0,00%	EN	PH
12	Comprobación de afecciones e identificación de propietarios afectados y modificaciones catastrales consecuencia de proyectos incoados por la DGOPI del Dpto CT	5-12-24	Tracasa Instrumental, S.L.	118.476,64	118.476,64	+ 0,00%	EN	PH
13	Actualización de catastro, elaboración de informes y certificados preceptivos para la inscripción en los Reg. de la Propiedad correspondientes de las parcelas de la CFN adscritas al Dpto CT	5-12-24	Tracasa Instrumental, S.L.	83.039,84	83.039,84	+ 0,00%	EN	PH
14	Asistencia técnica para la revisión estructural de los puentes de la red de carreteras de la CF, 2025-2028	11-11-24	SERTECNA, SA // Fhecor Ingenieros Consultores	670.001,20	603.001,08	- 10,00%	CO	CO
15	Proyecto constructivo de la variante de Lesaka en la carretera NA-4000	13-12-24	WSP Spain Apia, SAU	450.000,00	360.000,00	- 20,00%	CO	PH
16	Convenio entre C.A. la Rioja, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y el MITMA, para la actualización y mejora geométrica de delimitaciones territoriales intercomunitarias	2-07-24	Centro Nacional de Información Geográfica	30.000,00	30.000,00	+ 0,00%	EN	PH
17	Actualización de la Cartografía SIG en formato BTA del Mapa Topográfico de Navarra a escala 1:5000(MTNA5), en todas las capas de información, de todo el territorio de la DFN-2024	24-12-24	Tracasa Instrumental, SL	191.400,00	191.378,37	- 0,01%	EN	PH
SUMAS Y VALORES MEDIOS				16.304.556,83	14.837.243,72	- 9,00%		

SERVICIO PROMOTOR	
NI	NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
CO	CONSERVACIÓN
PR	ESTUDIOS Y PROYECTOS

SISTEMA DE ADJUDICACION	
EN	Encargo a Empresas Públicas
PN	Procedimiento Negociado
EM	Emergencia
CO	Conjunto Calidad y Precio
PO	Precio Ofertado

RELACIÓN COMPLETA DE ASISTENCIAS LIQUIDADAS 2024

RELACIÓN COMPLETA DE ASISTENCIAS LIQUIDADAS EN 2024

Nº	TITULO DEL TRABAJO DE ASISTENCIA	FECHA LIQUID.	CONTRATISTA ADJUDICATARIO	PRESUPUESTO ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO LIQUIDACIÓN	%	SERVICIO
1	Comprobación de afecciones e identificación de propietarios afectados y modificaciones catastrales consecuencia de proyectos 2023	8-02-24	Tracasa Instrumental, SL	90.290,28	79.625,15	-11,81%	PH
2	Actualización catastro, elaboración informes y certificados preceptivos para la inscripción en los registro de propiedad para el año 2023	8-02-24	Tracasa Instrumental, SL	122.469,43	93.119,74	-23,96%	PH
3	Asistencia a la Dirección de Explotación de la Autovía A-12 (Autovía del Camino), 2019-2023	12-02-24	UTE LRA Infraestructures Consulting, S.L./I.C.A.S.I	360.000,00	359.180,12	-0,23%	CO
4	Asistencia a la Dirección de Explotación de la Autovía A-21 (Autovía del Pirineo), 2019-2023	19-02-24	UTE LRA Infraestructures Consulting, S.L./I.C.A.S.I	600.000,00	599.553,54	-0,07%	CO
5	Asistencia técnica en materia de seguridad y salud de las obras de contratos de conservación de la Dirección General de Obras Públicas (LOTE 2)	8-05-24	Ingeniería y Prevención de Riesgos, S.L.	323.389,45	323.389,20	-0,00%	PH
6	Asistencia técnica en materia de seguridad y salud de las obras de contratos de conservación de la Dirección General de Obras Públicas (LOTE 1)	8-05-24	Ingeniería Prevención de Riesgos, S.L.	323.389,45	323.389,20	-0,00%	PH
7	Redacción proyecto constructivo de conversión N-121-A en vía 2+1, entre el p.k. 22+500 y el p.k. 35+300: variante de Ventas de Arraitz LOTE 3	31-10-24	ESTEYCO, S.A.	240.000,00	120.000,00	-50,00%	PH
8	Diseño y definición de la implantación de un sistema de pago por uso de infraestructuras viarias de la CFN y su gestión mediante una sociedad pública de futura creación	19-11-24	Pricewaterhouse,CPS y Cuatrecasas	423.500,00	338.800,00	-20,00%	CA
9	Redacción de estudios de seguridad vial en la Red de Carreteras de Navarra, 2019-2023	24-12-24	CIESM-INTEVIA, SAU	210.540,00	145.218,15	-31,03%	CO
10	Asist. Técnica Revisión estructural de los puentes de la red de carreteras de la CFN, años 2021-2024	24-12-24	Sertecna / FHECOR Ingenieros Consultores, S.A.	586.850,00	528.165,00	-10,00%	CO
11	Actualización de la Cartografía SIG en formato BTA del Mapa Topográfico de Navarra a escala 1:5000(MTNA5), en todas las capas de información, de todo el territorio de la DFN-2024	24-12-24	Tracasa Instrumental, SL	191.400,00	191.378,37	-0,01%	PH
12	Cartografía de precisión del mapa Topográfico Navarra 1:500 MTNA05, término municipal Pamplona	24-12-24	Tracasa Instrumental, SL	870.571,64	870.524,38	-0,01%	PH
13	Trabajos de vuelo fotogramétrico digital de 15 cm/pixel, apoyo de campo, aerotriangulación, modelos digitales de elevaciones y realización de la ortofotografía básica ... de todo el territorio de la CFN en el año 2024	24-12-24	Tracasa Instrumental, SL	296.539,70	274.869,30	-7,31%	PH
14	Trabajos de digitalización, georreferencia, ortofotos rápidas e incorporación a la fototeca de los negativos de vuelos históricos de distintas fechas y escalas del territorio de la CFN	24-12-24	Tracasa Instrumental, SL	165.768,04	165.742,66	-0,02%	PH
15	Mantenimiento del Centro de Control y de los sistemas e instalaciones de él dependientes, túneles, alumbrado, semáforos y aforadores, años 2021-2024	11-11-24	UTE SICE SDAD. IBÉRICA CONST. ELÉ/ETRA NORTE, S.A.	5.079.399,60	5.334.730,07	+ 5,03%	CO
16	Gestión del Centro de Control y Vigilancia de Incidencias de Vialidad en la Red de Carreteras de Navarra, años 2021-2024	6-11-24	Revenga Ingenieros, SA	2.247.912,59	2.295.859,08	+ 2,13%	CO
17	Encargo Nasertic. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 2023	5-02-24	Nasertic	93.816,59	76.212,41	-18,76%	CO
18	Proyecto constructivo de conversión de la carretera N-121 A en vía 2+1 entre el P.K. 10+500 y el P.K. 22+500:variante de Burutain	16-05-24	DH PROYECTOS DE INGENIERIA, S.L.P.	81.675,00	81.675,00	+ 0,00%	CO
SUMAS Y VALORES MEDIOS				12.307.511,77	12.201.431,37	-0,86%	


SERVICIO PROMOTOR

NI	NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
CO	CONSERVACIÓN
PR	ESTUDIOS Y PROYECTOS

**RESUMEN DE DIFERENCIAS LIQUIDACIÓN /
ADJUDICACIÓN DE ASISTENCIAS 2024**

AÑO 2024

DIFERENCIA LIQUIDACIÓN / ADJUDICACIÓN	Nº DE ASISTENCIAS	%	SUMAS DE PRESUPUESTOS ADJUDICACIÓN	%
> 50 %	0	0,00%	-	0,00%
40 % a 50 %	0	0,00%	-	0,00%
30 % a 40 %	0	0,00%	-	0,00%
20 % a 30 %	0	0,00%	-	0,00%
10 % a 20 %	0	0,00%	-	0,00%
0 % a 10 %	2	10,53%	7.327.312,19	59,54%
0 %	4	21,05%	1.956.193,58	15,89%
- 10 % a 0 %	6	31,58%	1.843.389,70	14,98%
-20 % a - 10 %	3	15,79%	607.606,87	4,94%
< - 20 %	4	21,05%	573.009,43	4,66%
TOTALES	19	100,00%	12.307.511,77	100,00%

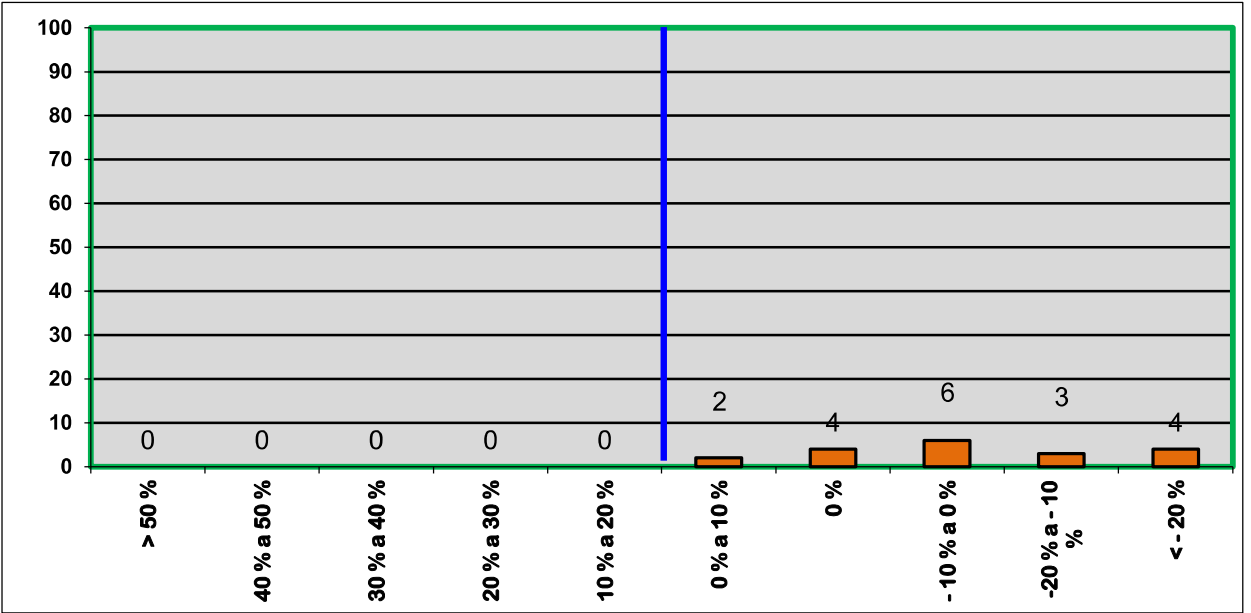

RESUMEN

DIFERENCIA LIQUIDACIÓN / ADJUDICACIÓN	Nº DE ASISTENCIAS	%	SUMAS DE PRESUPUESTOS ADJUDICACIÓN	%
MAYOR DE 10 %	0	0,00%	-	0,00%
MENOR DE 10 %	19	100,00%	12.307.511,77	100,00%
TOTALES	19	100,00%	12.307.511,77	100,00%
