



Adjudicación y liquidación de contratos del año 2000

Se muestra, a continuación, la evolución de magnitudes de obras y asistencias, es decir, del total de contratos adjudicados y liquidados en el año 2000. En las siguientes tablas y gráficos se presta especial atención a la evolución de magnitudes de los contratos de obras y al resumen de diferencias de liquidación/adjudicación tanto de obras como de asistencias.

1. Evolución de magnitudes conjuntas de Obras y Asistencias (total contratos)

El número total de contratos adjudicados y liquidados a lo largo del año 2000 da idea de la actividad desarrollada por la Dirección General de Obras Públicas.

La evolución de estas cifras totales durante los últimos cinco años se recoge en el siguiente cuadro:

Número de Contratos Adjudicados y Liquidados					
	1996	1997	1998	1999	2000
Nº Contratos Adjudicados	142	202	171	175	121
Nº Contratos Liquidados	79	110	154	214	146

Como puede apreciarse, el número de contratos totales de obras y asistencias técnicas adjudicadas se mantiene en 121, lo que supone una disminución respecto a los años anteriores.

En relación con el número de contratos liquidados, se mantiene la evolución de los últimos años y se reduce respecto al número de contratos liquidados en 1999. No obstante, el presupuesto de liquidación del conjunto de contratos del año 2000 se sitúa en los 13.260 millones de pesetas, equivalente a la media de los dos años anteriores.

2. Evolución de magnitudes de contratos de Obras

En los gráficos incluidos a continuación se analiza el volumen de obra liquidada y el comportamiento de la desviación media en liquidación de obras, así como el número de contratos de obra que han rebasado el 10% de desviación final.

En cuanto a la cantidad de obra licitada y adjudicada y a sus montantes económicos, así como a la baja media, destacan las siguientes cifras:


Número de Obras Adjudicadas y Liquidadas					
	1996	1997	1998	1999	2000
Nº Obras Adjudicadas	98	124	69	86	51
Nº Obras Liquidadas	79	110	65	113	73

Obras Adjudicadas: Presupuestos de Licitación/Adjudicación y Baja Media Anual de Adjudicación					
	1996	1997	1998	1999	2000
Presupuestos Licitación	11.171.276.373	24.076.722.924	17.355.135.774	13.990.987.941	12.279.017.246
Presupuestos Adjudicación	8.426.122.325	17.884.604.202	15.385.325.720	12.699.027.926	10.799.385.344
Baja Media Anual de Adjudicación	-24,57%	-25,72%	-11,35%	-9,23%	-12,05%

Como se observa, en el último año se han liquidado 73 obras, se han adjudicado 51 y se ha realizado una contratación de obra de 10.800 millones de pesetas, que viene a continuar con un significativo nivel de contratación de obras públicas en Navarra, lo que sin duda ha mantenido la actividad del sector y ha servido para retomar actuaciones muy necesarias en materia de infraestructuras en la Comunidad Foral. En conjunto, esta actividad ha llevado a la contratación de más de 65.196 millones de pesetas en los últimos cinco años.

El porcentaje de baja anual en las adjudicaciones de obra es un dato también significativo sobre la gestión de contratación del Departamento. Este dato se obtiene comparando el total de presupuesto adjudicado con los presupuestos de proyecto. Los datos disponibles y procesados se remontan a 1996 y los resultados son los siguientes:

Baja Media de Adjudicaciones de Obras

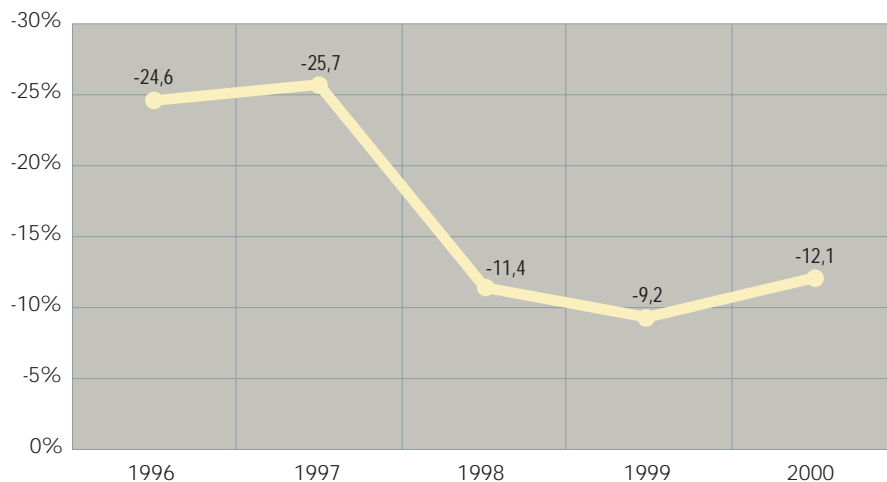


El dato registrado en 2000 (baja media de adjudicación de -12,05%) se considera aceptable, ya que ha sido política de este Departamento conseguir unas adjudicaciones de obra a unos precios razonables.

No obstante, el leve incremento experimentado respecto al año anterior puede estar explicado por un descenso en el total del presupuesto adjudicado por el procedimiento de concurso (del 82,83% al 70,51%, porcentajes recogidos en los dos siguientes gráficos) e incluso por el descenso total de obra adjudicada.

Obras Adjudicadas: Porcentaje de Sistemas de Adjudicación (sobre el total de presupuesto adjudicado)				
	1997	1998	1999	2000
Concurso	85,42%	87,50%	82,83%	70,51%
Subasta	11,24%	2,33%	0	18,39%
Proc. Negociado	0,09%	3,63%	2,06%	5,43%
Encomiendas	1,89%	5,86%	2,41%	5,68%

Contratos año 2000

Evolución del Presupuesto Adjudicado por procedimiento de Adjudicación

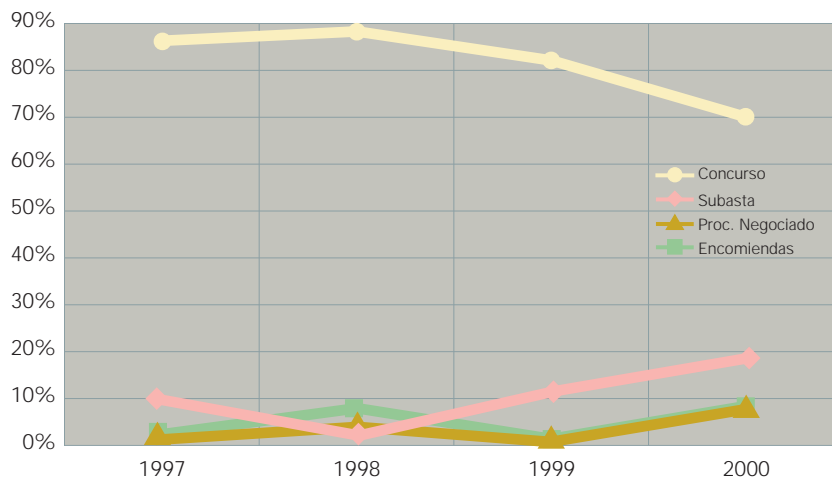

Mención expresa dentro de este apartado merecen las adjudicaciones de obra del Canal de Navarra. La promoción de su construcción corresponde a la Administración General del Estado y al Gobierno de Navarra a través del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, mientras que la empresa pública Canal de Navarra S.A. se encarga de licitarlas y adjudicarlas.

Dado que dichas obras tienen su ámbito de ejecución en la Comunidad Foral y que van a suponer una elevada tasa de actividad en el sector de la obra civil en Navarra, se considera de interés reflejar el volumen anual de adjudicaciones de obra que se van a realizar en torno al Canal de Navarra, complementarias del resto de adjudicaciones de obra civil del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones.

En concreto las adjudicaciones realizadas son las siguientes:

Adjudicaciones de obra del Canal de Navarra		Año 2000
Obra adjudicada	Presupuesto de adjudicación	Baja en adjudicación
Canal de Navarra Tramo 1	2.967.931.863	- 23,3 %
Canal de Navarra Tramo 2	7.938.312.881	- 11,2 %
TOTAL	10.906.244.744	

Es decir, dos actuaciones contratadas en relación con la obra del Canal de Navarra durante el año 2000 que suponen otros 10.906 millones de pesetas de inversión en obra pública.

Por su parte, y en relación con las liquidaciones, el de la desviación media anual es, sin duda, uno de los datos de mayor relevancia desde el punto de vista de la gestión de la Administración en relación con sus contratos de obra.


El Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones se marcó como objetivo en noviembre de 1996 rebajar las desviaciones finales de obra hasta alcanzar una cifra razonable que se fijaba en una media anual del 10% respecto del presupuesto de adjudicación. El plazo de consecución de este objetivo se estableció en 3-4 años, ya que se partía de cifras muy elevadas (un +38% en las obras liquidadas en 1996).

El esfuerzo técnico y de gestión de la Administración y la colaboración eficaz de las empresas constructoras han permitido obtener una evolución destacadamente positiva en este parámetro.

El resumen de la evolución de este importante indicador se recoge en los gráficos adjuntos.

Obras Liquidadas: Presupuestos de Adjudicación/Liquidación y Desviación Final de Obras					
	1996	1997	1998	1999*	2000
Presupuestos Adjudicación	13.889.523.232	11.542.701.201	9.970.769.374	13.546.107.943	11.437.226.645
Presupuestos Liquidación	19.149.559.026	13.246.334.804	10.512.613.460	14.559.232.172	12.496.486.741
Desviación Final de Obras	+37,87%	+14,76%	+5,43%	+7,48%	+9,26%


Desviación Media en Liquidaciones de Obras

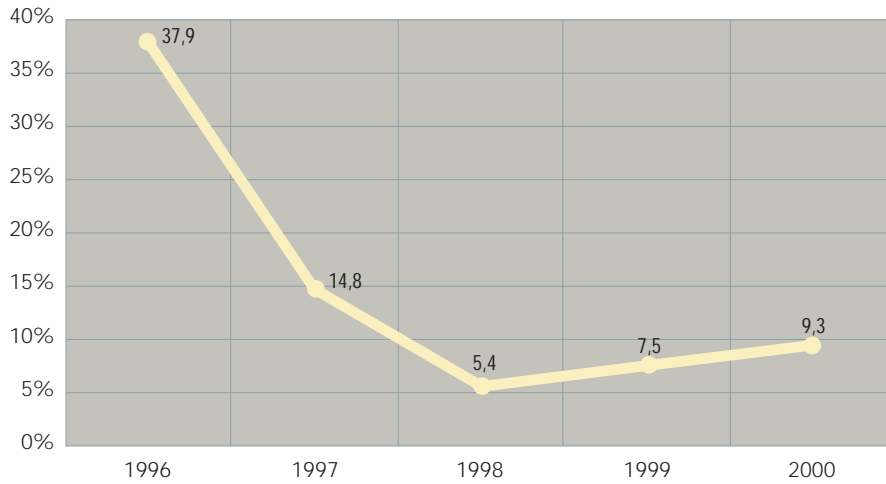

En ambos gráficos se comprueba que ya en el año 1998 se consiguió descender por debajo de la desviación media del 10%, alcanzando una media anual del 5,43%, a lo largo de 1999 se mantuvo dicha cifra de desviación media en el 7,48%, y finalmente en el año 2000 se mantiene en el 9,26%, lo que permite considerar que se ha logrado el objetivo y que, por tanto, la labor de los próximos ejercicios se centrará en procurar consolidar las liquidaciones de obras dentro de la mencionada franja.


Es también significativo reseñar que de 73 expedientes de obras liquidados en 2000, tan sólo 8 han rebasado el 10% de desviación final, mientras que los 65 contratos restantes se han liquidado con una desviación final cada uno de ellos inferior al 10%. El gráfico anexo detalla la evolución registrada desde 1996:

Número de Obras según sus desviaciones

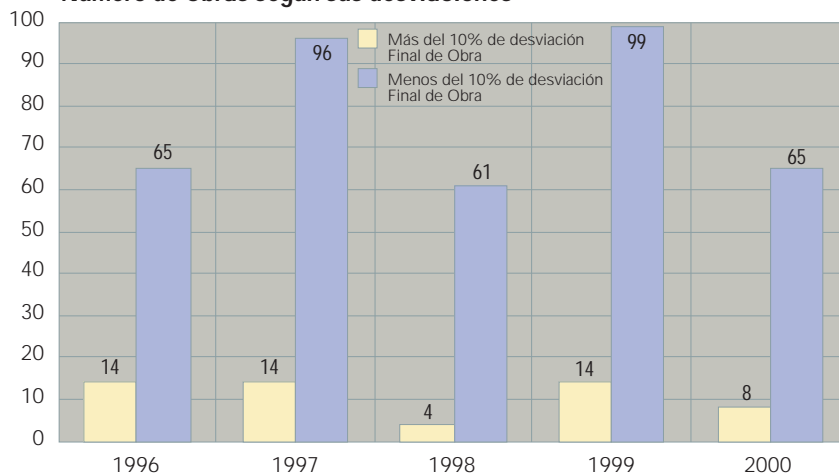

3. Evolución de magnitudes de Contratos de Asistencias

El número de asistencias adjudicadas en el ejercicio 2000 asciende a 70, siendo el de asistencias liquidadas ligeramente superior, tal y como se recoge en el siguiente gráfico:

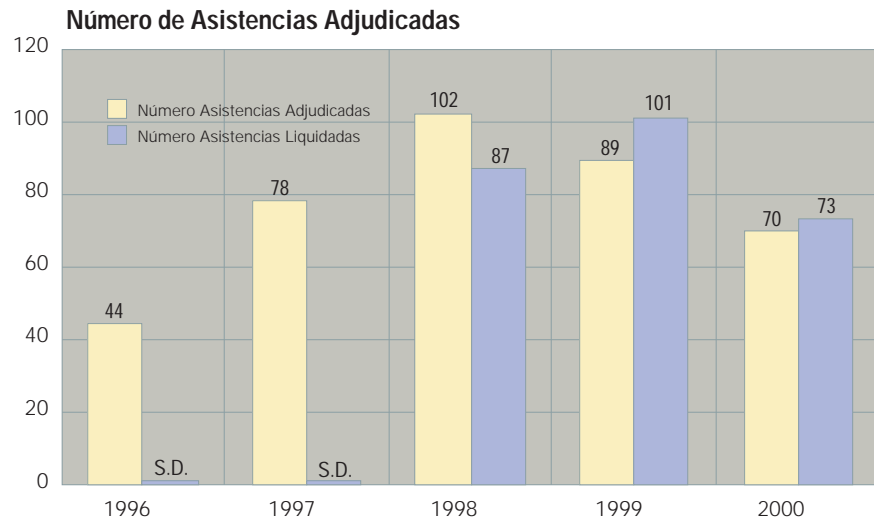

Respecto a las asistencias adjudicadas, puede observarse una evolución creciente en los últimos años que alcanza en 2000 las 984.114.364 pesetas, con una baja de adjudicación del -9,38% (dentro de la franja del 10% marcada como objetivo).

