

La obra adjudicada en 2002 supone 86 millones y medio de euros, un 24% más que en 2001

Se muestra a continuación la evolución de magnitudes de obras y asistencias, es decir, del total de contratos adjudicados y liquidados en el año 2002. En las siguientes tablas y gráficos se presta especial atención a la evolución de magnitudes de los contratos de obras y al resumen de diferencias de liquidación/adjudicación tanto de obras como de asistencias.

<p>EVOLUCIÓN DE MAGNITUDES CONJUNTAS DE OBRAS Y ASISTENCIAS (TOTAL CONTRATOS)</p> <p>El número total de contratos adjudicados y liquidados a lo largo del año 2002 da idea de la actividad desarrollada por la Dirección General de Obras Públicas. La evolución de estas cifras totales durante los últimos siete años se recoge en la tabla 1. Como puede apreciarse, el número de contratos totales de obras y asistencias técnicas adjudicadas ascendió en 2002</p>	<p>a un total de 115, cifra levemente inferior a la del ejercicio anterior, y que se sigue situando por debajo de los niveles alcanzados en años anteriores. Por lo que se refiere a los contratos liquidados, su número se situó en 107, manteniéndose la tendencia ya observada en 2001, con respecto a 2000. El presupuesto de liquidación del conjunto de contratos del año 2002 fue de 53.655.480 euros, por debajo de los 57.627.711 euros del ejercicio presupuestario anterior.</p>	<p>EVOLUCIÓN DE MAGNITUDES DE OBRAS</p> <p>En las tablas incluidas a continuación se analiza el volumen de obra liquidada y el comportamiento de la desviación media en liquidación de obras, así como el número de contratos de obra que han rebasado el 10% de desviación final. En cuanto a la cantidad de obra adjudicada y a sus montantes económicos, así como a la baja media, destacan las cifras de la tabla 2. Como se observa, durante 2002 se liquidaron 61 obras, se adjudicaron 58</p>
---	---	--

Tabla 1. Número de contratos adjudicados y liquidados

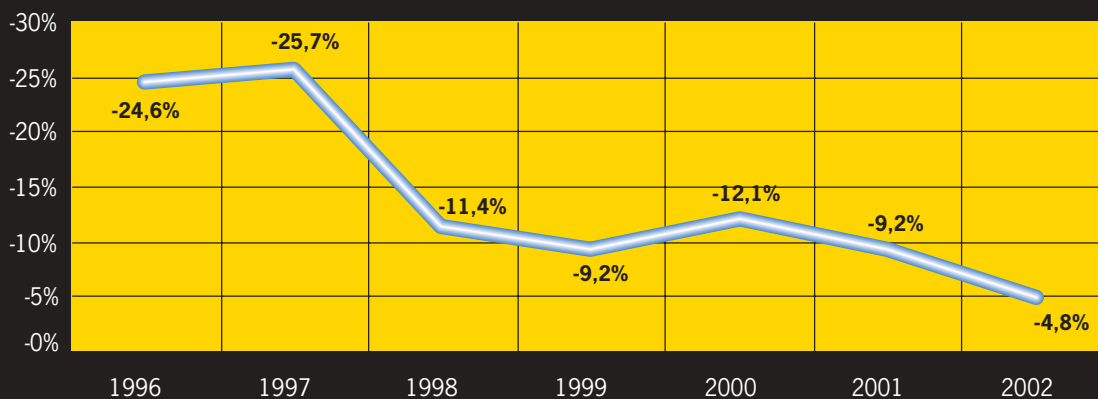
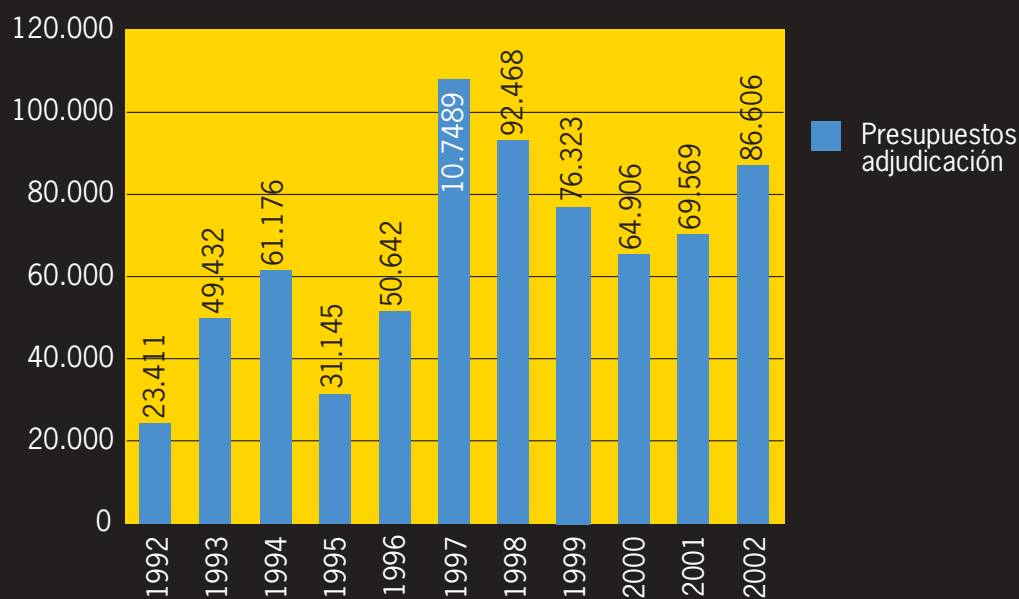
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Nº contratos adjudicados	142	202	171	175	121	122	115
Nº contratos liquidados	79	110	154	214	146	135	107

Tabla 2. Número de obras adjudicadas y liquidadas

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Nº obras adjudicadas	98	124	69	86	51	64	58
Nº obras liquidadas	79	110	65	113	73	79	61

Tabla 3. Obras adjudicadas. Presupuestos de licitación/adjudicación y baja media anual de adjudicación

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Presupuestos licitación	67.140.723	144.704.019	104.306.467	84.087.531	73.798.380	76.650.638	90.937.639
Presupuestos adjudicación	50.642.015	107.488.636	92.467.670	76.322.695	64.905.613	69.568.613	86.605.942
Baja media anual de adjudicación	-24,57%	-25,72%	-11,35%	-9,23%	-12,05%	-9,24%	-4,76%

Tabla 4. Dirección General de Obras Públicas. Baja media de adjudicaciones de obras**Tabla 5. Obras Adjudicadas en miles de Euros**

Variante de Tudela

y se realizó una contratación de obra de 86.605.942 euros, confirmando así el alto nivel de contratación de obras públicas que registra Navarra, lo que sin duda ha mantenido la actividad del sector y ha servido para retomar actuaciones muy necesarias en materia de infraestructuras en la Comunidad Foral. En conjunto, esta actividad ha llevado en los últimos siete años a la contratación de 548 millones de euros. (tabla 5). El porcentaje de baja anual en las adjudicaciones de obra es un dato también significativo sobre la

gestión de contratación de la Dirección General. Este dato se obtiene comparando el total de presupuesto adjudicado con los presupuestos de proyecto. Durante el año 2002 se registró una bajada media del -4,76%, lo que representa prácticamente la mitad la obtenida en 2001. En todo caso, el -4,76% de baja media de adjudicación en 2002 se considera aceptable, ya que ha sido política de la Dirección General de Obras Públicas conseguir unas adjudicaciones de obra a unos precios razonables (tablas 3 y 4).

Las adjudicaciones analizadas con anterioridad se realizaron mediante los sistemas de adjudicación de concurso (86,13%), subasta (6,35%), procedimiento negociado (5,77%) y encomiendas (1,75%), tal y como se muestra en la **tabla 6**, donde se observa la evolución en los últimos seis años.

OBRAS LIQUIDADAS EN 2002

En la **tabla 7** se muestran los importes de Liquidación de obra y Desviación Final del ejercicio 2002, así como la evolución en los años anteriores.

En relación con las liquidaciones, el porcentaje de desviación media anual es, sin duda, uno de los datos de mayor relevancia desde el punto de vista de la gestión de la Administración en relación con sus contratos de obra.

La Dirección General de Obras Públicas se marcó como objetivo en noviembre



Obras del puente entre Fustiñana y Ribaforada.

Tabla 6. Dirección General de Obras Públicas. Evolución del presupuesto adjudicado por procedimiento de adjudicación

	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Concurso	85,42%	87,50%	82,83%	70,51%	72,66%	86,13%
Subasta	11,24%	2,33%	12,71%	18,39%	6,96%	6,35%
Proc. Negociado	0,09%	3,63%	2,06%	5,43%	12,12%	5,77%
Encomiendas	1,89%	5,86%	2,41%	5,68%	8,26%	1,75%

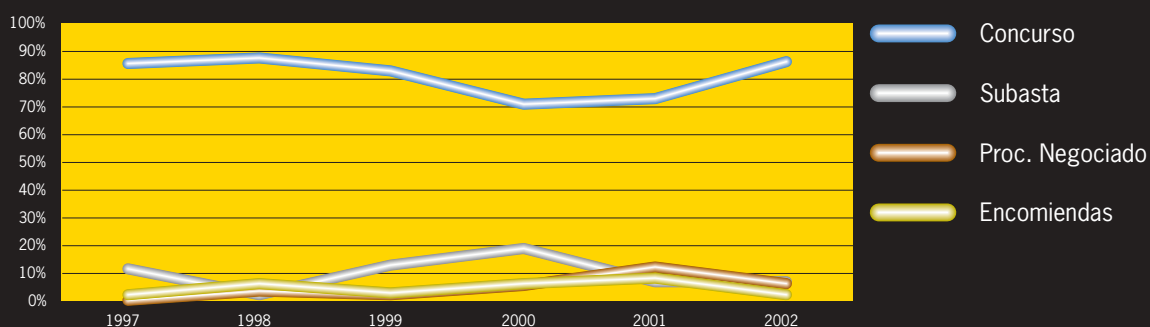


Tabla 7. Presupuestos de Adjudicación / Liquidación y Desviación Final de Obras

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Presupuestos adjudicación	83.477.716	69.373.031	59.925.531	81.413.748	68.739.117	50.667.575	46.909.335
Presupuestos liquidación	115.091.168	79.612.076	63.182.079	87.502.748	75.105.398	54.200.661	50.207.914
Desviación final de obras	+37,87%	+14,76%	+5,43%	+7,48%	+9,26%	6,97%	+7,03%

de 1996 rebajar las desviaciones finales de obra hasta alcanzar una cifra razonable que se fijaba en una media anual del 10% respecto del presupuesto de adjudicación. El plazo de consecución de este objetivo se estableció en 3-4 años, ya que se partía de cifras muy elevadas (un +38% en las obras liquidadas en 1996).

El esfuerzo técnico y de gestión de la Administración y la colaboración eficaz de las empresas constructoras ha permitido obtener una evolución destacadamente positiva en este parámetro. El resumen de la evolución de este

importante indicador se recoge en la **tabla 8**.

En dicha tabla se comprueba que ya en el año 1998 se consiguió descender por debajo de la desviación media del 10%, alcanzando una media anual del 5,43%; a lo largo de 1999 se mantuvo dicha cifra de desviación media en el 7,48%; en el año 2000 se situó en el 9,26%; y en el año 2001 en el 6,97%. Durante el año pasado la desviación media en liquidaciones de obras fue del 7%, lo que representa mantener el mejor resultado de los últimos 7 años, con la salvedad de 1998. Esto permite considerar que

se ha logrado el objetivo y que, por tanto, la labor de los próximos ejercicios se centrará en procurar consolidar las liquidaciones de obras dentro de la mencionada franja. Es también significativo reseñar que de los 61 expedientes de obras liquidados en 2002, tan sólo 2 han rebasado el 10% de desviación final, mientras que los 59 contratos restantes se han liquidado con una desviación final cada uno de ellos inferior al 10%. La **tabla 9** detalla la evolución registrada desde 1996.

Tabla 8. Desviación media en liquidaciones de obra

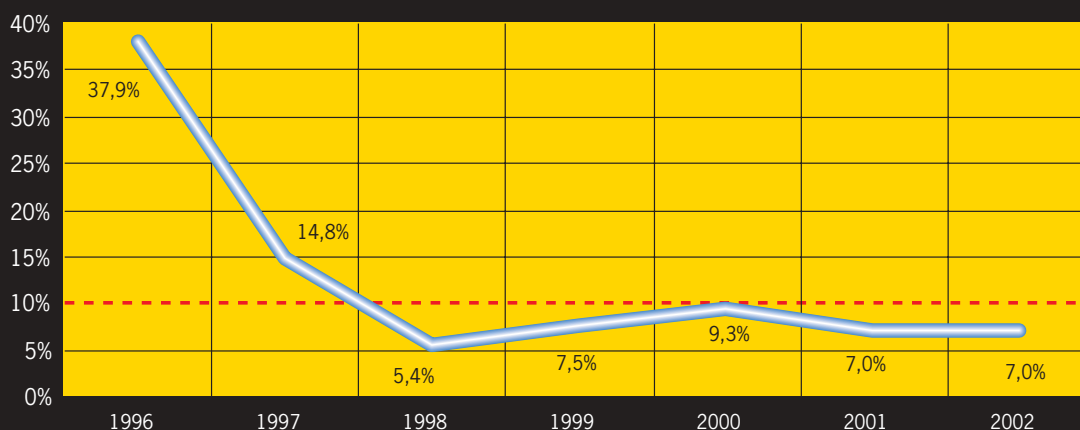


Tabla 9. Dirección General de Obras Públicas. N° de obras según sus desviaciones

